

【①川内沢ダム本体工事 転流工の施工完了！】



【①川内沢ダム本体工事 転流工の施工完了！】



【①川内沢ダム本体工事 濁水処理設備設置完了！】



【②付替市道6号橋上部工工事 桁架設状況！】




川内沢ダム建設事業全体平面図

現在：4工区4業者施工中！

(R5)付替市道舗装工事 (株)和建设 R5.7.11~R6.3.29 【進捗率1%】 ④	(R4 補)農道改良工事 (株)宮城林産 R5.3.28~R5.10.31 【進捗率15%】 ③	(R4)付替市道6号橋上部工工事 ライプディック(株) R4.10.27~R5.12.28 【進捗率77%】 ②	川内沢ダム本体工事 西松・奥田・グリーン企画特定JV R4.10.20~R8.3.25 【進捗率4%】 ①
--	---	---	--

【8月末の見所】

- ①川内沢ダム本体工事 転流工の施工完了！
- ①川内沢ダム本体工事 濁水処理設備設置完了！
- ②付替市道6号橋上部工工事 桁設置状況！

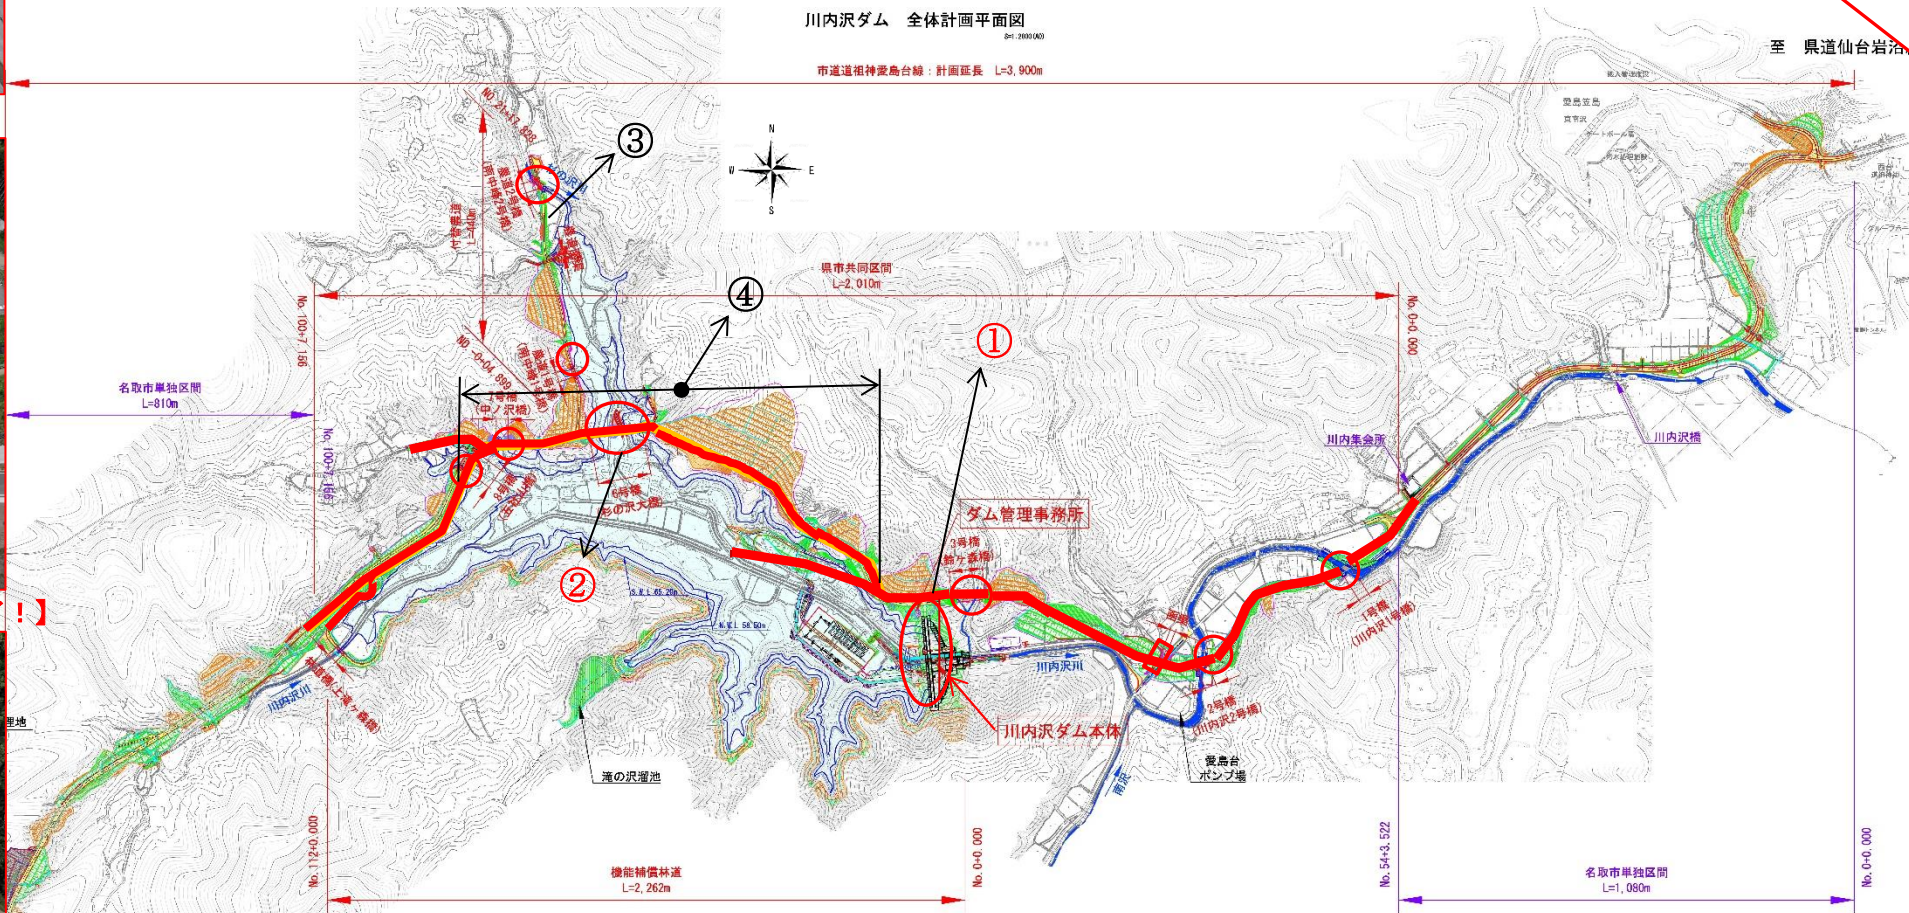

付替市道 L=2,010m
 【施工中】 道路改良工事
 橋梁工事
 函渠工工事

令和4年9月作成

