

現在：13工区8業者施工中！

川内沢ダム建設事業全体平面図

【6月末の見所】

- ③ (R3) 道路改良工事(その2)の補強土壁本格化！
- ⑥ ダム仮設工外工事のヤード造成！



川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

(R3補)道路改良工事(その4)
奥田建設(株)
R4.4.11~R5.3.31
【進捗率 19%】 ⑨

(R3)7号橋上部工事
東日本コンクリート(株)
R3.11.11~R4.7.29
【進捗率 86%】 ⑦

(R3)農道橋下部工事
(株)石井土木
R3.7.30~R4.11.30
【進捗率 77%】 ②

【③(R3)道路改良工事(その2)の補強土壁本格化！】



(R3)道路改良工事(その2)
グリーン企画建設(株)
R3.10.8~R5.1.31
【進捗率 38%】 ③

(R3補)道路改良工事(その5)
(有)渋谷組
R4.4.1~R5.3.31
【進捗率 22%】 ⑩

(R3)8号橋上部工事
ライブディック(株)
R3.11.11~R4.9.30
【進捗率 41%】 ⑧

市道道祖神愛島台線：計画延長 L=3,900m

(R3)6号橋下部工事
(株)深松組
R3.6.30~R4.9.30
【進捗率 85%】 ①

(R3補)農道改良外工事
(株)深松組
R4.4.1~R5.3.31
【進捗率 1%】 ⑪


【⑥ダム仮設工外工事のヤード造成！】



①(R3)6号橋下部工事



橋梁下部工事(7号橋, 8号橋)

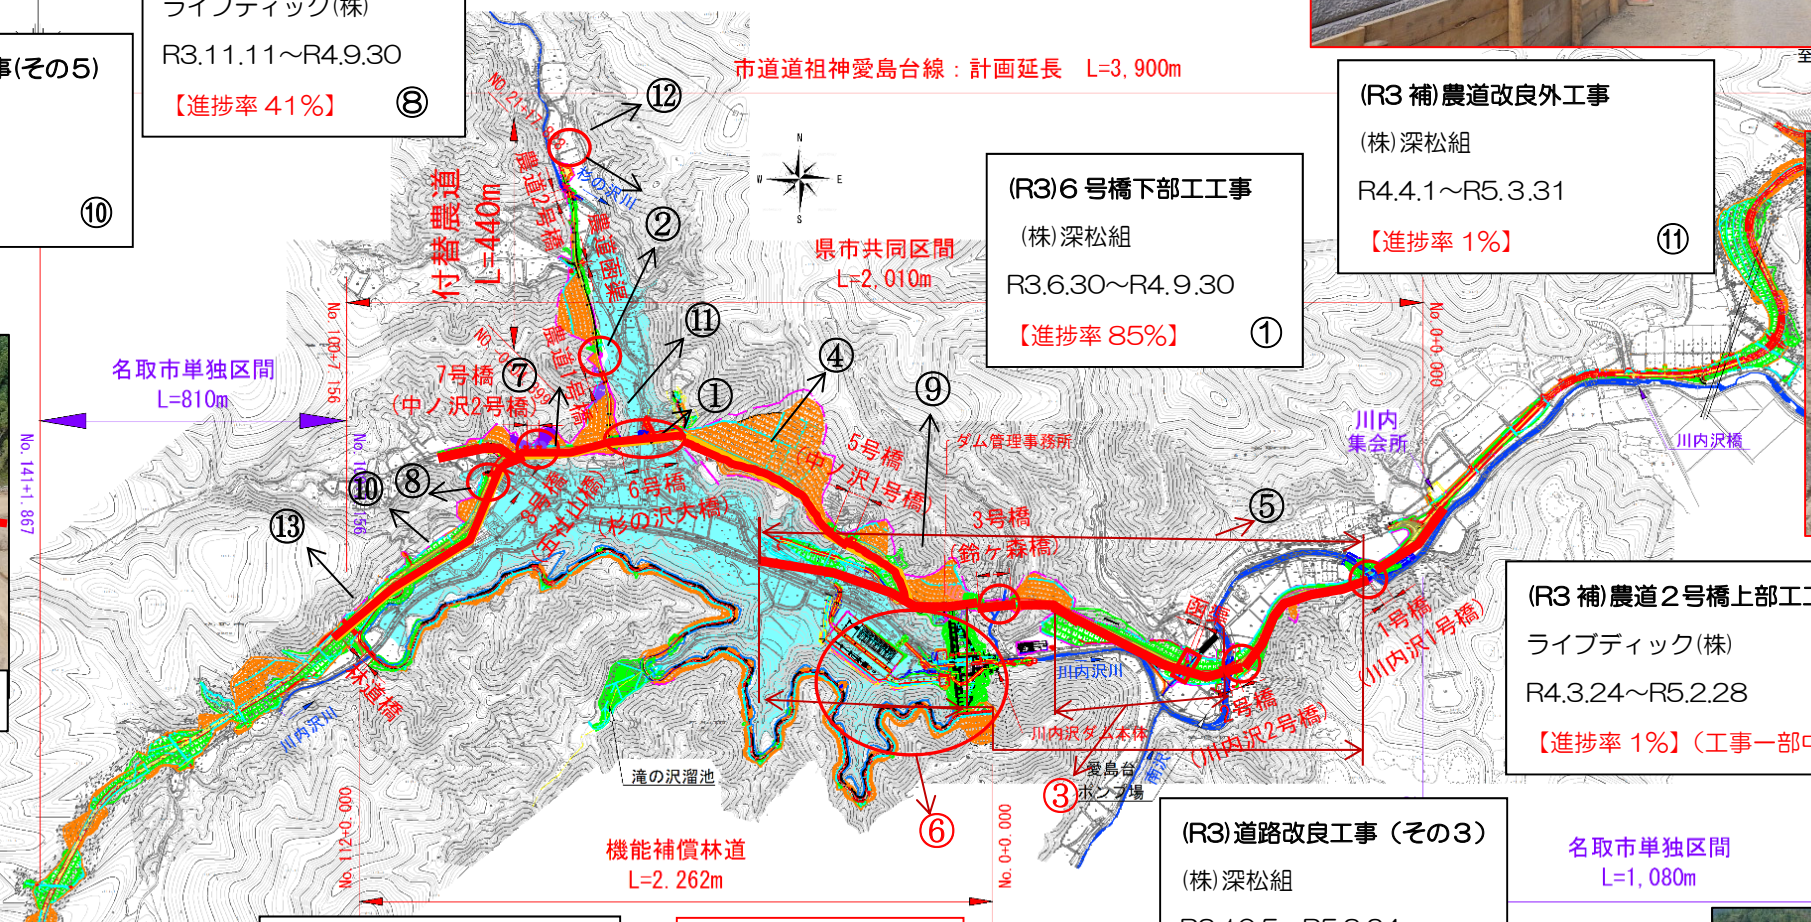

(R3補)農道2号橋上部工事
ライブディック(株)
R4.3.24~R5.2.28
【進捗率 1%】(工事一部中止中) ⑫

(R3)舗装工事
(株)佐藤渡辺東北支店
R3.10.12~R5.1.31
【進捗率 17%】 ⑤

(R3補)林道改良外工事
グリーン企画建設(株)
R4.4.1~R5.3.31
【進捗率 5%】 ⑬

(R3)ダム仮設工外工事
奥田建設(株)
R3.11.5~R5.2.28
【進捗率 23%】 ⑥


(R3)道路改良工事(その3)
(株)深松組
R3.10.5~R5.3.24
【進捗率 36%】 ④



⑬(R3補)林道改良外工事



付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)

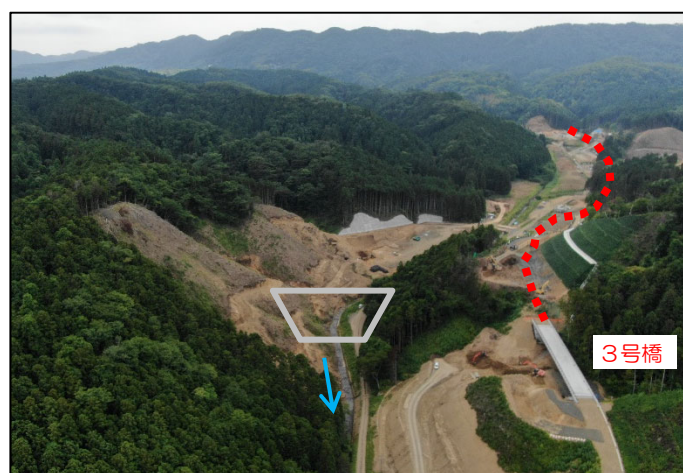

ダム建設位置



④(R3)道路改良工事(その3)

- 付替市道 L=2,010m
- 【施工中】道路改良工事
- 橋梁工事
- 函渠工工事
