

【4月末の見所】

- ① (R3) 6号橋橋脚立ち上がり！
- ④ (R3) 道路改良工事(その3)工事の掘削本格化！
- ⑦ (R3) 7号橋上部工工事の桁架設完了！



川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

【⑦7号橋上部工工事の桁架設完了！】



橋梁下部工工事(7号橋, 8号橋)



付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)



ダム建設位置




付替道路全景(2号橋~3号橋)



付替道路全景(1号橋~函渠)

川内沢ダム建設事業全体平面図

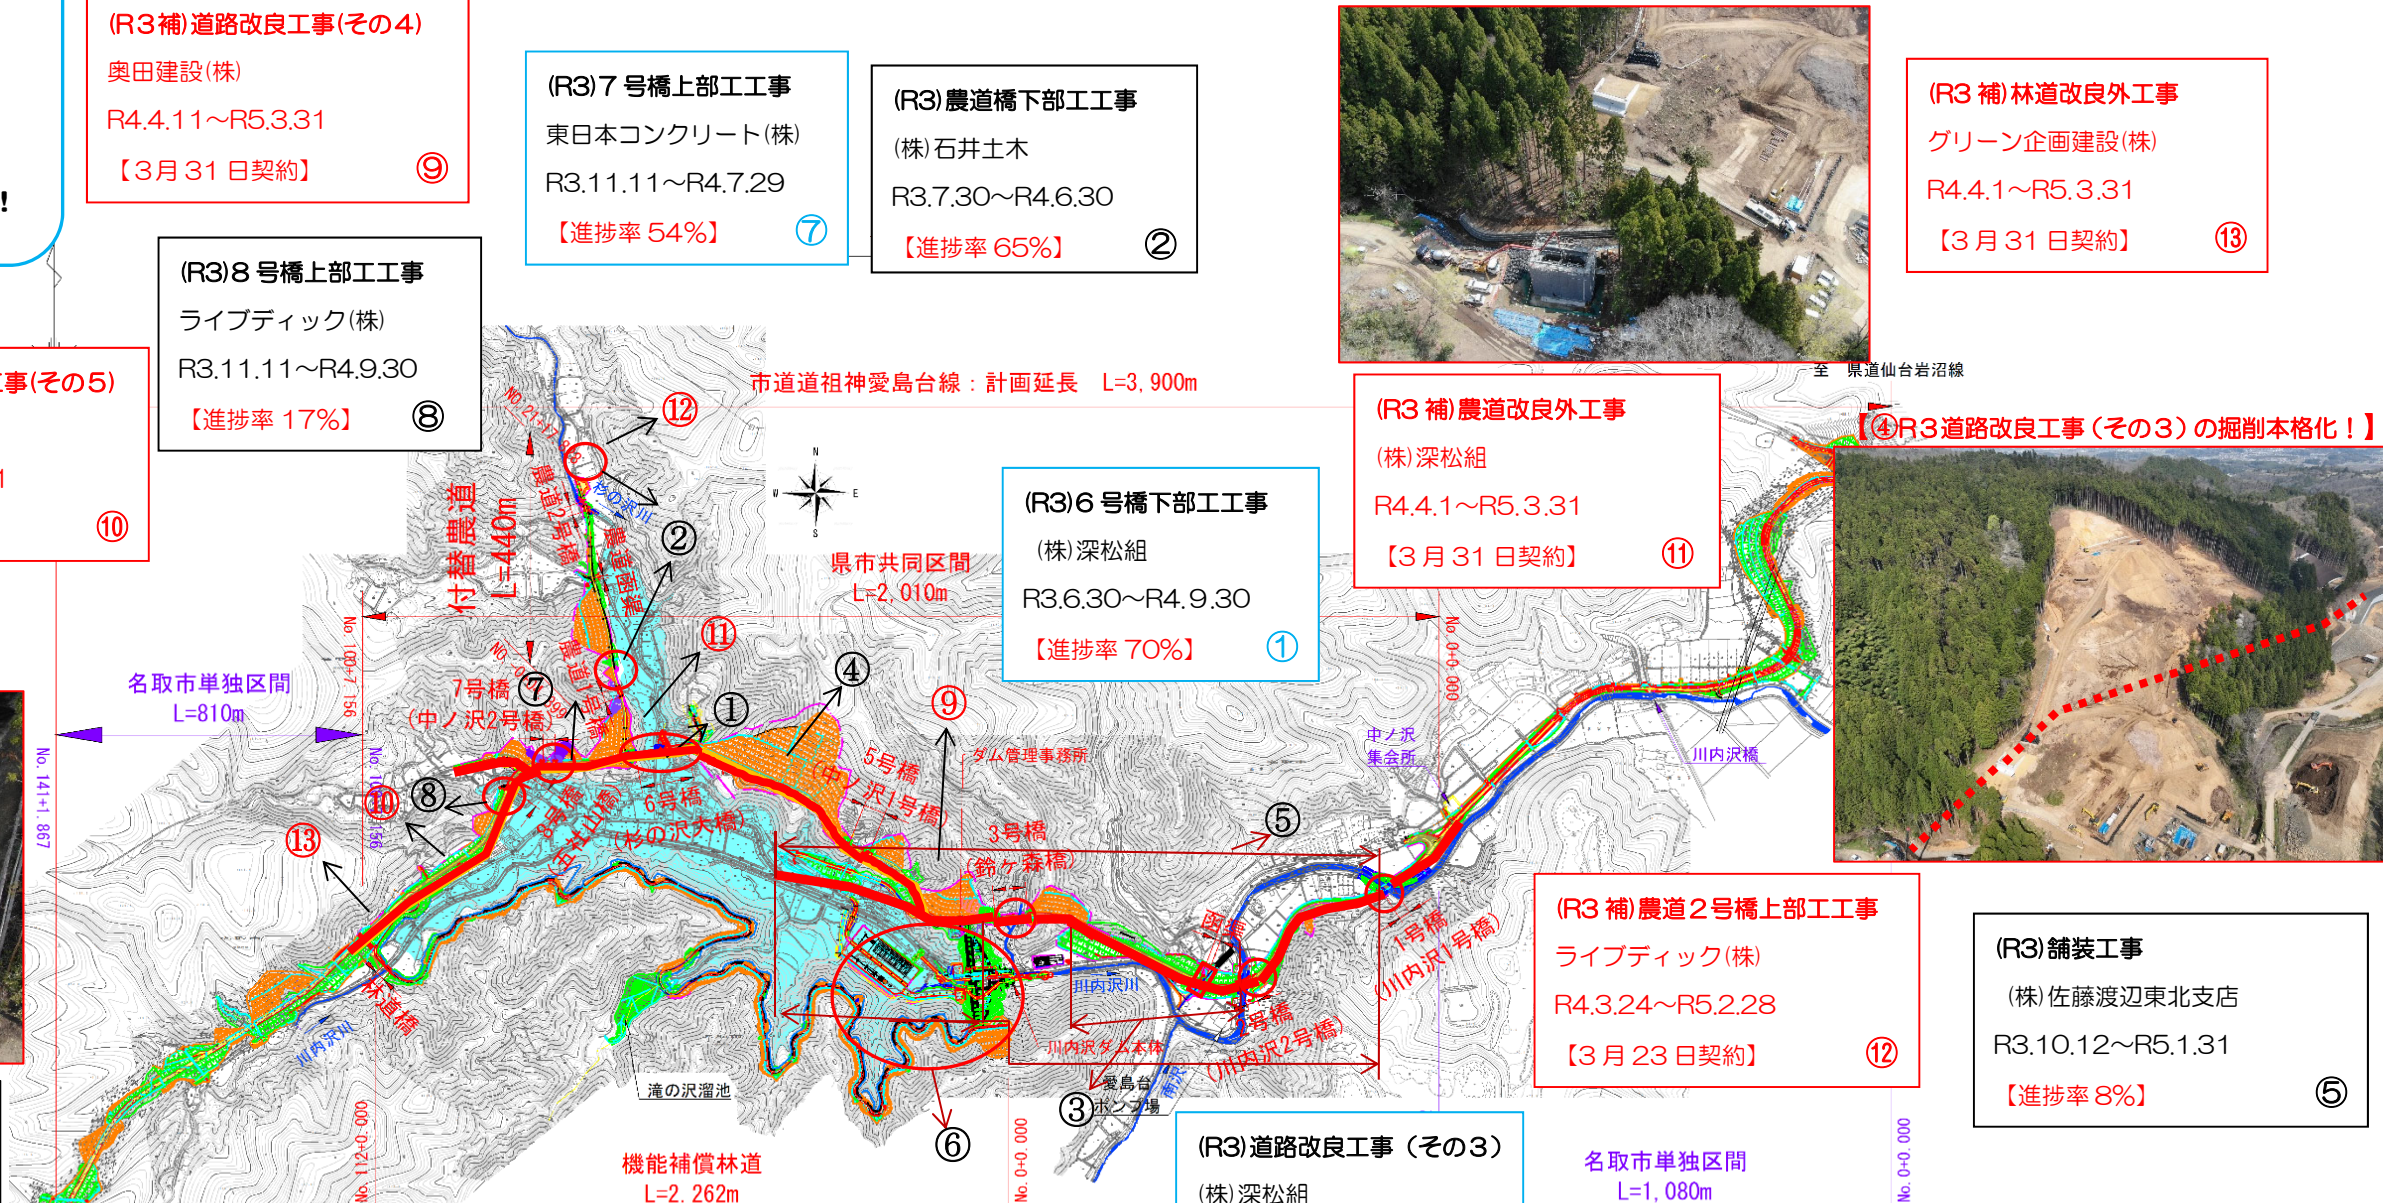

(R3補)道路改良工事(その4)
奥田建設(株)
R4.4.11~R5.3.31
【3月31日契約】 ⑨

(R3)7号橋上部工工事
東日本コンクリート(株)
R3.11.11~R4.7.29
【進捗率 54%】 ⑦

(R3)農道橋下部工工事
(株)石井土木
R3.7.30~R4.6.30
【進捗率 65%】 ②

(R3)8号橋上部工工事
ライブディック(株)
R3.11.11~R4.9.30
【進捗率 17%】 ⑧

(R3補)道路改良工事(その5)
(有)渋谷組
R4.4.1~R5.3.31
【3月31日契約】 ⑩

【①6号橋下部工工事の橋脚立ち上がり！】



現在: 13工区8業者施工中!

(R3補)林道改良外工事
グリーン企画建設(株)
R4.4.1~R5.3.31
【3月31日契約】 ⑬



【④R3道路改良工事(その3)の掘削本格化！】

(R3補)農道改良外工事
(株)深松組
R4.4.1~R5.3.31
【3月31日契約】 ⑪

(R3)6号橋下部工工事
(株)深松組
R3.6.30~R4.9.30
【進捗率 70%】 ①

(R3補)農道2号橋上部工工事
ライブディック(株)
R4.3.24~R5.2.28
【3月23日契約】 ⑫

(R3)舗装工事
(株)佐藤渡辺東北支店
R3.10.12~R5.1.31
【進捗率 8%】 ⑤

(R3)道路改良工事(その2)
グリーン企画建設(株)
R3.10.8~R5.1.31
【進捗率 21%】 ③

(R3)ダム仮設工外工事
奥田建設(株)
R3.11.5~R5.2.28
【進捗率 15%】 ⑥

(R3)道路改良工事(その3)
(株)深松組
R3.10.5~R5.3.24
【進捗率 22%】 ④

付替市道 L=2,010m
【施工中】

- 道路改良工事
- 橋梁工事
- 函渠工工事
