

川内沢ダム建設事業全体平面図

現在：12工区7業者施工中！

【8月末の見所】

- ⑤舗装工事の道路盛土本格化！
- ⑦8号橋桁架設完了！
- ⑫林道改良外工事の迂回路完成！



(R3補)道路改良工事(その4)
奥田建設(株)
R4.4.11~R5.3.31
【進捗率 41%】 ⑧

(R3)農道橋下部工工事
(株)石井土木
R3.7.30~R4.11.30
【進捗率 87%】 ②

(R3 補)農道改良外工事
(株)深松組
R4.4.1~R5.3.31
【進捗率 3%】 ⑩

(R3)舗装工事
(株)佐藤渡辺東北支店
R3.10.12~R5.1.31
【進捗率 21%】 ⑤

(R3)8号橋上部工工事
ライブティック(株)
R3.11.11~R4.12.12
【進捗率 77%】 ⑦


(R3)6号橋下部工工事
(株)深松組
R3.6.30~R4.9.30
【進捗率 98%】 ①



【⑤舗装工事の道路盛土本格化！】

(R3補)道路改良工事(その5)
(有)渋谷組
R4.4.1~R5.3.31
【進捗率 23%】 ⑨

【⑦8号橋桁架設完了！】

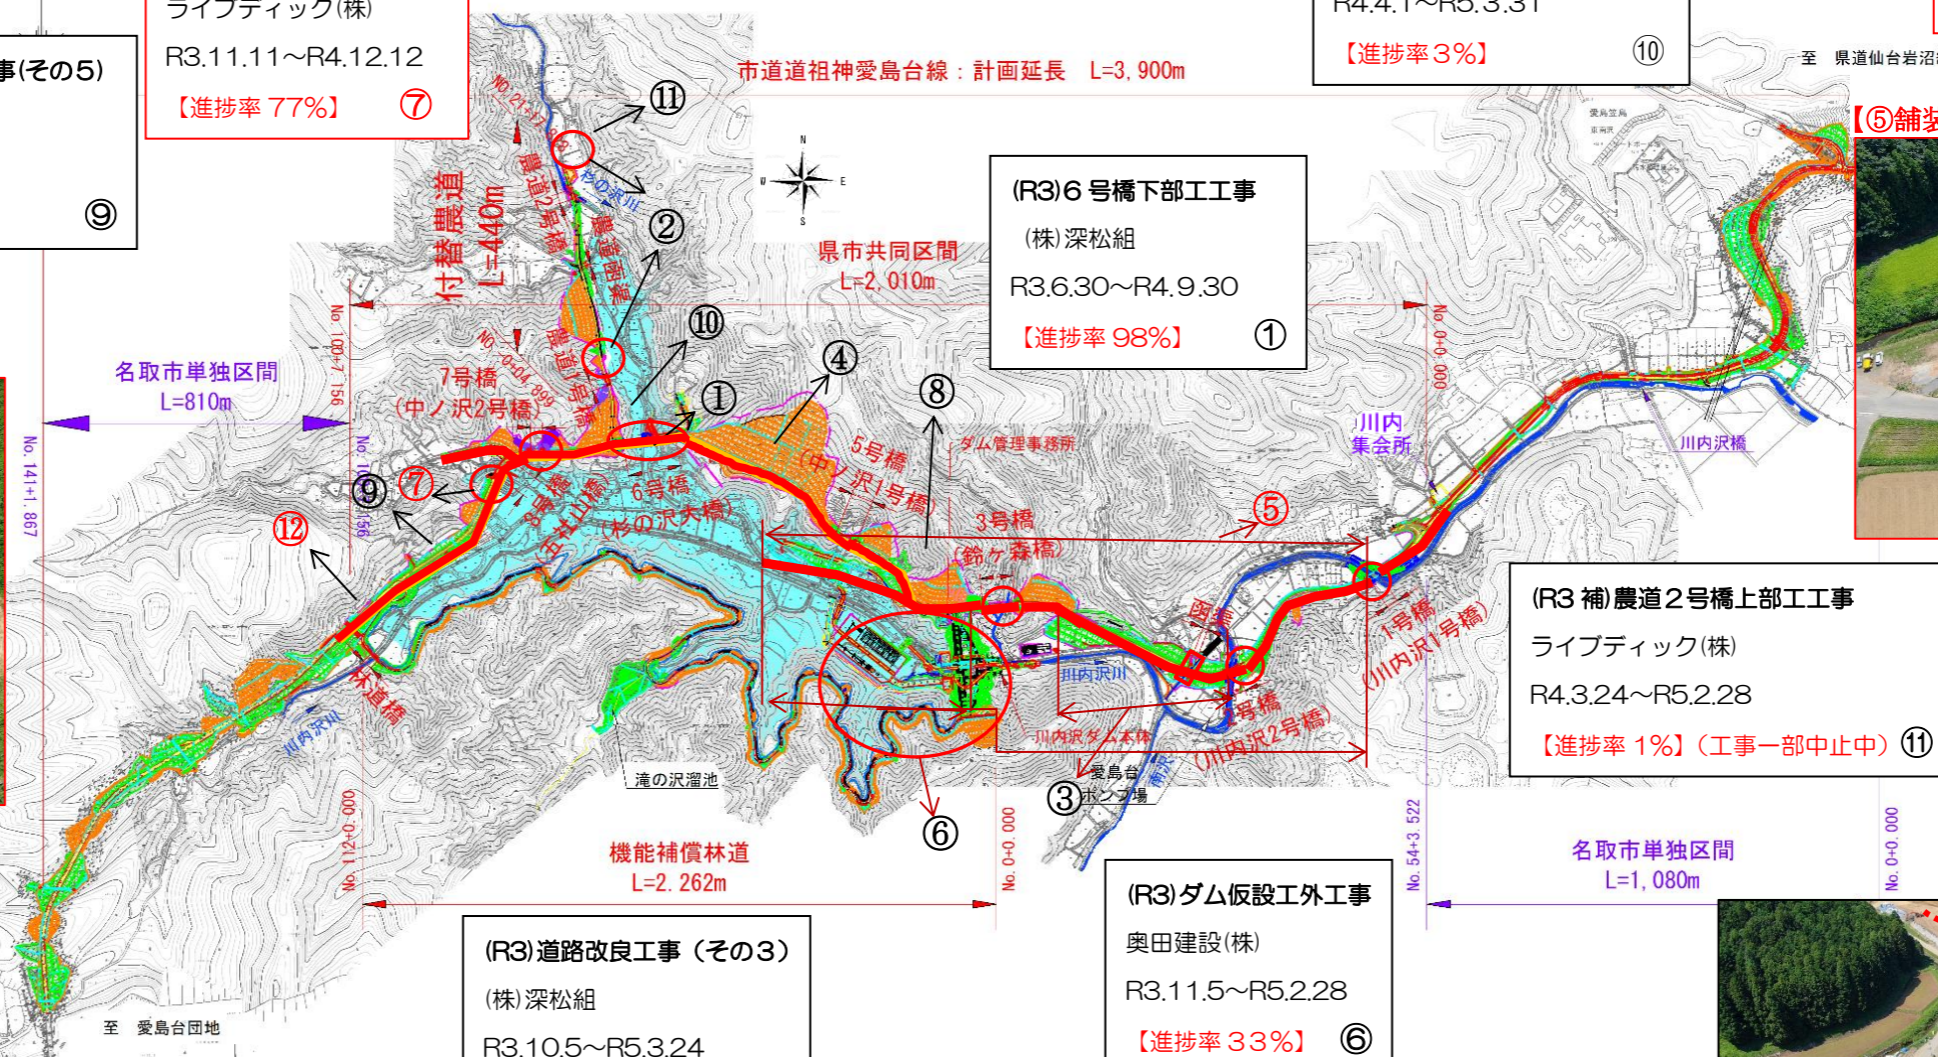

(R3 補)農道2号橋上部工工事
ライブティック(株)
R4.3.24~R5.2.28
【進捗率 1%】(工事一部中止中) ⑪

(R3)道路改良工事(その2)
グリーン企画建設(株)
R3.10.8~R5.1.31
【進捗率 61%】 ③

(R3 補)林道改良外工事
グリーン企画建設(株)
R4.4.1~R5.3.31
【進捗率 19%】 ⑫

(R3)道路改良工事(その3)
(株)深松組
R3.10.5~R5.3.24
【進捗率 45%】 ④

(R3)ダム仮設工外工事
奥田建設(株)
R3.11.5~R5.2.28
【進捗率 33%】 ⑥

【⑫林道改良工事の迂回路完成！】



付替市道 L=2,010m

【施工中】道路改良工事

○ 橋梁工事

□ 函渠工工事
