

川内沢ダム建設事業全体平面図

現在：12工区7業者施工中！  
完成：2工区2業者

【①農道橋下部工工事の完成！】



(R3補)道路改良工事(その4)  
奥田建設(株)  
R4.4.11~R5.3.31  
【進捗率86%】 ⑦

(R3)農道橋下部工工事  
(株)石井土木  
R3.7.30~R4.11.30  
【完成!】 ①

(R3補)農道改良外工事  
(株)深松組  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率25%】 ⑨


(R3)舗装工事  
(株)佐藤渡辺東北支店  
R3.10.12~R5.1.31  
【進捗率38%】 ④

【11月末の見所】  
①農道橋下部工工事の完成！  
④係船坂路コンクリート舗装完了！  
⑥8号橋上部工工事の完成！

【④係船坂路コンクリート舗装完了!】



(R3補)林道改良外工事  
グリーン企画建設(株)  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率57%】 ⑪

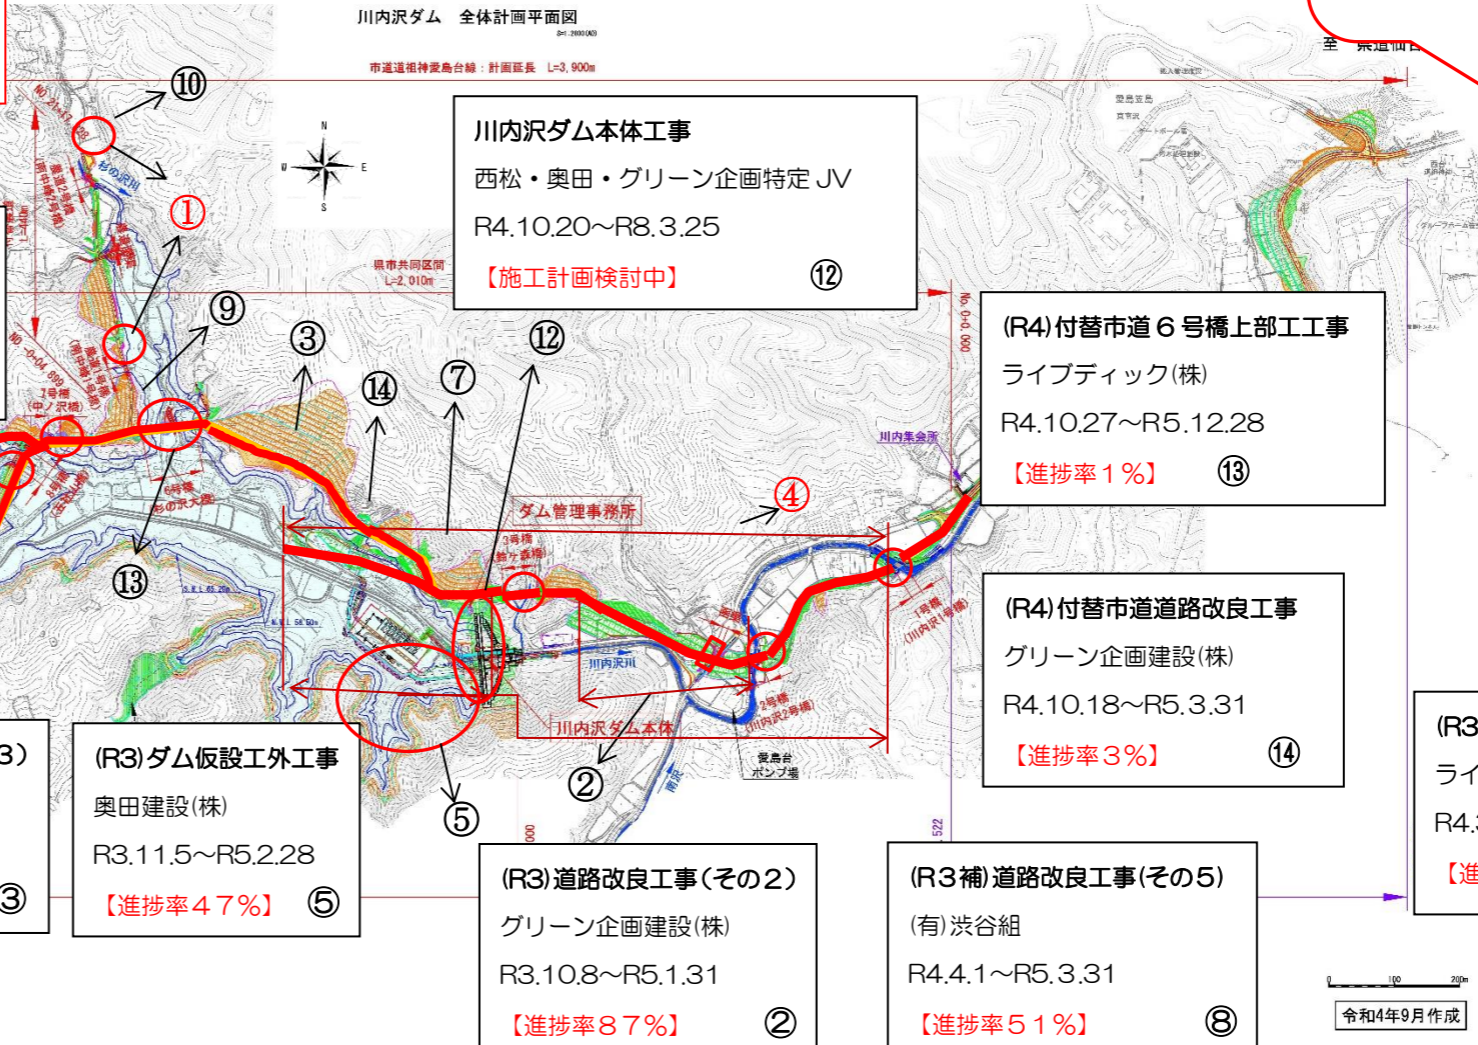

川内沢ダム本体工事  
西松・奥田・グリーン企画特定JV  
R4.10.20~R8.3.25  
【施工計画検討中】 ⑫

(R4)付替市道6号橋上部工工事  
ライブディック(株)  
R4.10.27~R5.12.28  
【進捗率1%】 ⑬

(R4)付替市道道路改良工事  
グリーン企画建設(株)  
R4.10.18~R5.3.31  
【進捗率3%】 ⑭

【⑥8号橋上部工工事の完成!】



(R3)道路改良工事(その3)  
(株)深松組  
R3.10.5~R5.3.24  
【進捗率69%】 ③

(R3)ダム仮設工外工事  
奥田建設(株)  
R3.11.5~R5.2.28  
【進捗率47%】 ⑤

(R3)道路改良工事(その2)  
グリーン企画建設(株)  
R3.10.8~R5.1.31  
【進捗率87%】 ②

(R3補)道路改良工事(その5)  
(有)渋谷組  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率51%】 ⑧

(R3補)農道2号橋上部工工事  
ライブディック(株)  
R4.3.25~R5.3.31  
【進捗率5%】 ⑩



川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

令和4年9月作成



付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)



ダム建設位置



付替道路全景(2号橋~函渠~3号橋手前)

付替市道 L=2,010m

【施工中】

- 道路改良工事 (Red line)
- 橋梁工事 (Red circle)
- 函渠工工事 (Red square)
