

# 川内沢ダム建設事業全体平面図

現在：12工区7業者施工中！

【①道路改良工事（その2）まもなく完成！】



(R3補)道路改良工事(その4)  
奥田建設(株)  
R4.4.11~R5.3.31  
【進捗率99%】 ⑤

川内沢ダム本体工事  
西松・奥田・グリーン企画特定JV  
R4.10.20~R8.3.25  
【施工計画検討中】 ⑩

(R3補)農道改良外工事  
(株)深松組  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率38%】 ⑦

(R3)舗装工事  
(株)佐藤渡辺東北支店  
R3.10.12~R5.3.31  
【進捗率39%】 ③


【12月末の見所】  
①道路改良工事（その2）まもなく完成！  
②道路改良工事（その3）まもなく完成！  
⑦農道改良外工事の交差点部が見えてきました！

【②道路改良工事（その3）まもなく完成！】



(R3補)林道改良外工事  
グリーン企画建設(株)  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率72%】 ⑨

【⑦農道改良外工事の交差点部が見えてきました！】

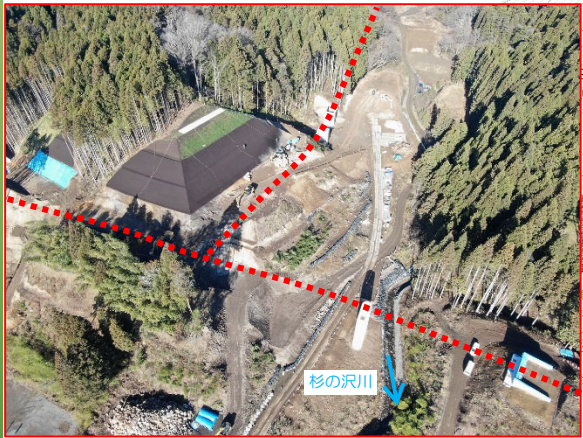

(R3)道路改良工事（その3）  
(株)深松組  
R3.10.5~R5.3.24  
【進捗率75%】 ②

(R3)ダム仮設工外工事  
奥田建設(株)  
R3.11.5~R5.2.28  
【進捗率61%】 ④

(R3)道路改良工事(その2)  
グリーン企画建設(株)  
R3.10.8~R5.1.31  
【進捗率91%】 ①

(R3補)道路改良工事(その5)  
(有)渋谷組  
R4.4.1~R5.3.31  
【進捗率63%】 ⑥



(R3補)農道2号橋上部工事  
ライブディック(株)  
R4.3.25~R5.3.31  
【進捗率12%】 ⑧

(R4)付替市道6号橋上部工事  
ライブディック(株)  
R4.10.27~R5.12.28  
【進捗率7%】 ⑪

(R4)付替市道道路改良工事  
グリーン企画建設(株)  
R4.10.18~R5.3.31  
【進捗率14%】 ⑫




川内沢ダムイメージキャラクター「川内あい」

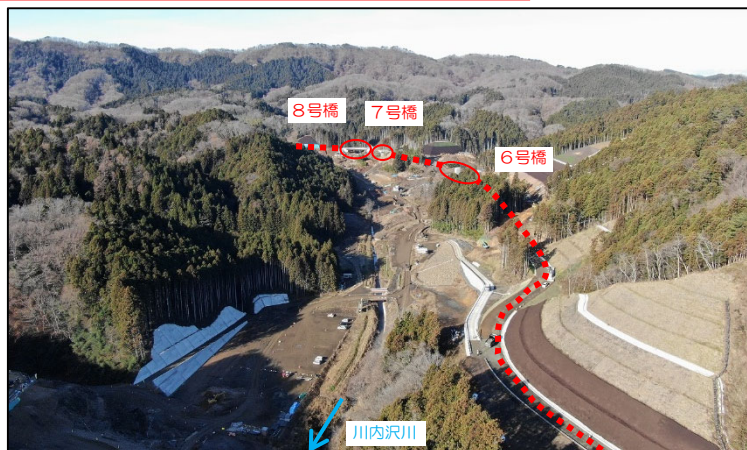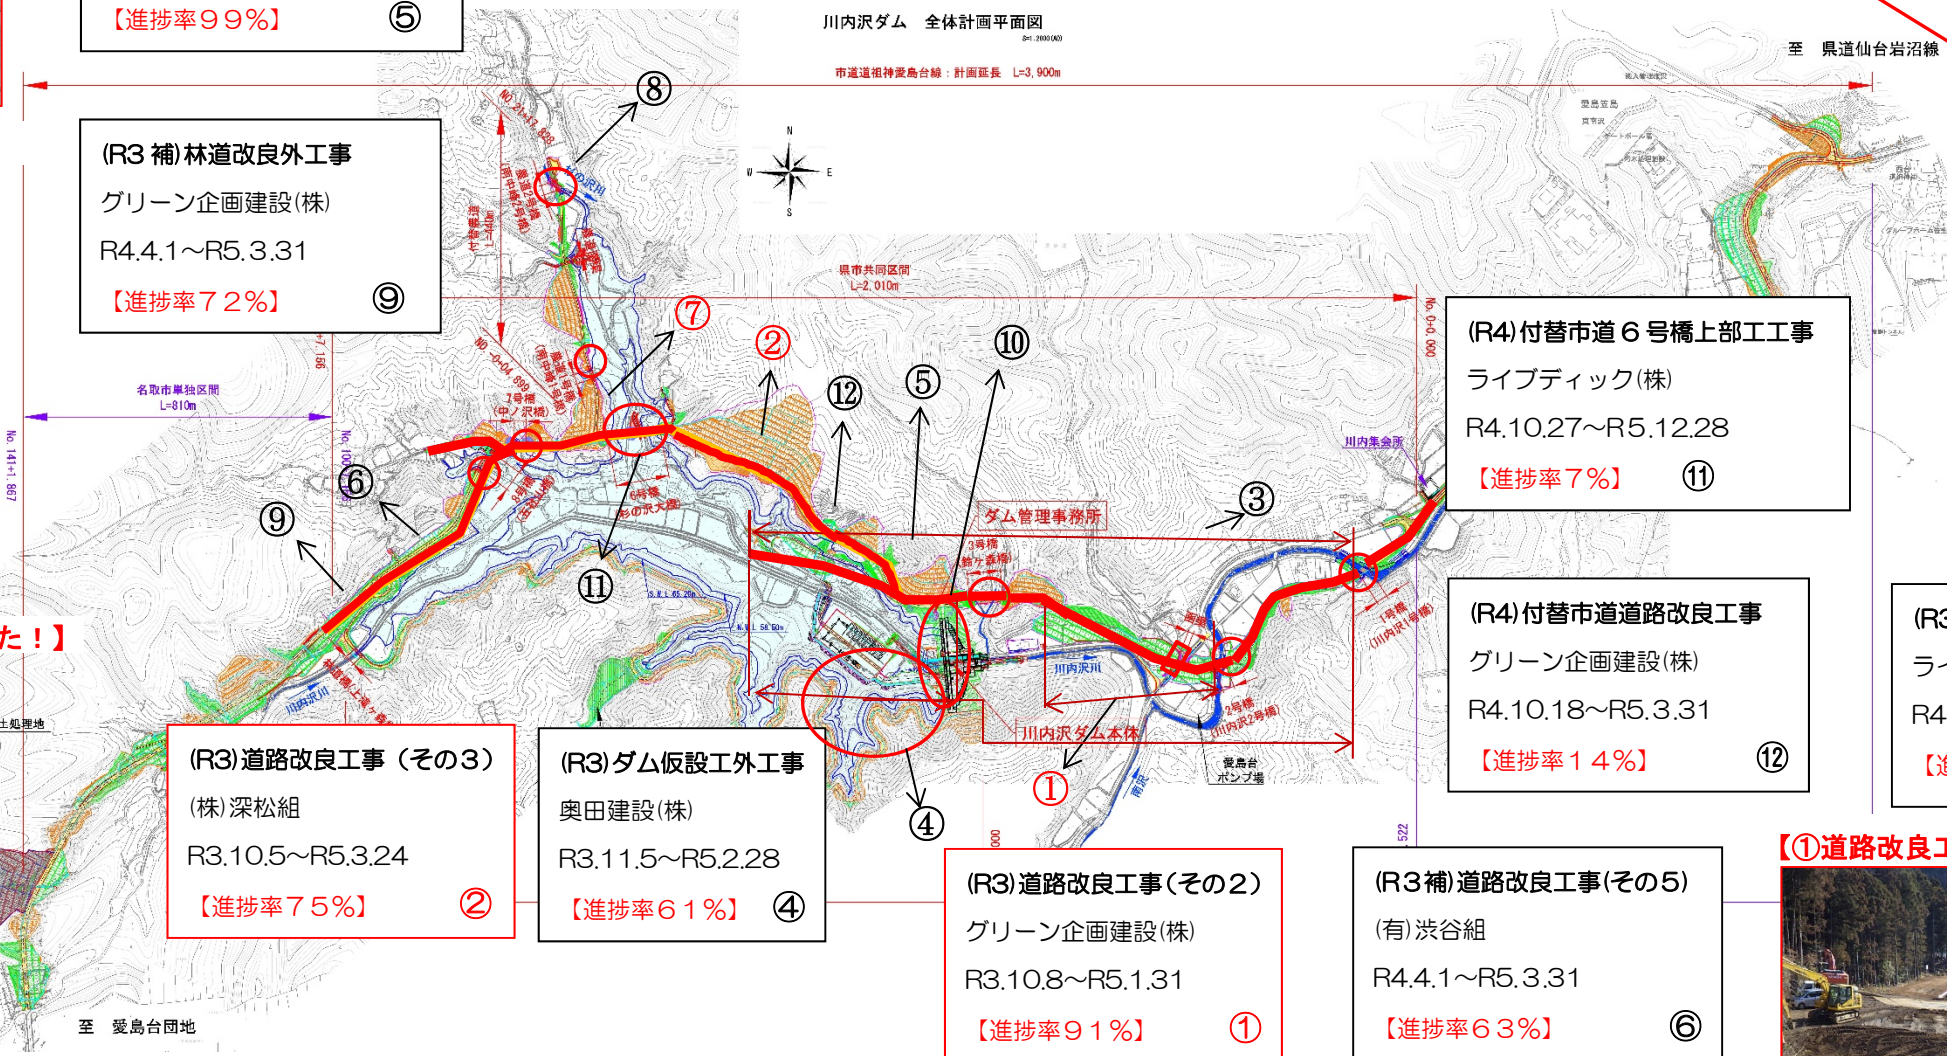

付替道路全景(ダム建設位置~8号橋)



ダム建設位置

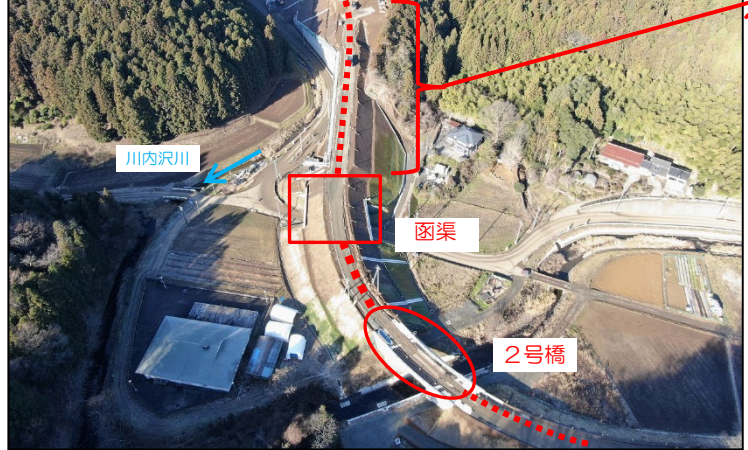

付替道路全景(2号橋~函渠~3号橋手前)



【①道路改良工事（その2）まもなく完成！】

