

化粧坂 通信 第五号


宮城県気仙沼土木事務所

掘削工事の進捗率が**77%**となりました！


【工事進捗状況】

化粧坂道路改良工事は、令和2年12月の工事説明会開催からこれまで本格的な掘削工事を実施してまいりましたが、順調に工事は進捗し、令和4年1月末時点で126,000m³の全体掘削土量のうち、96,800m³の掘削が完了し、掘削土量ベースでの進捗率が77%となりました。


掘削工事の完了後、法面の植生、側溝設置、舗装工事等を順次行い、令和4年度内の供用開始を目指して事業を推進してまいります。

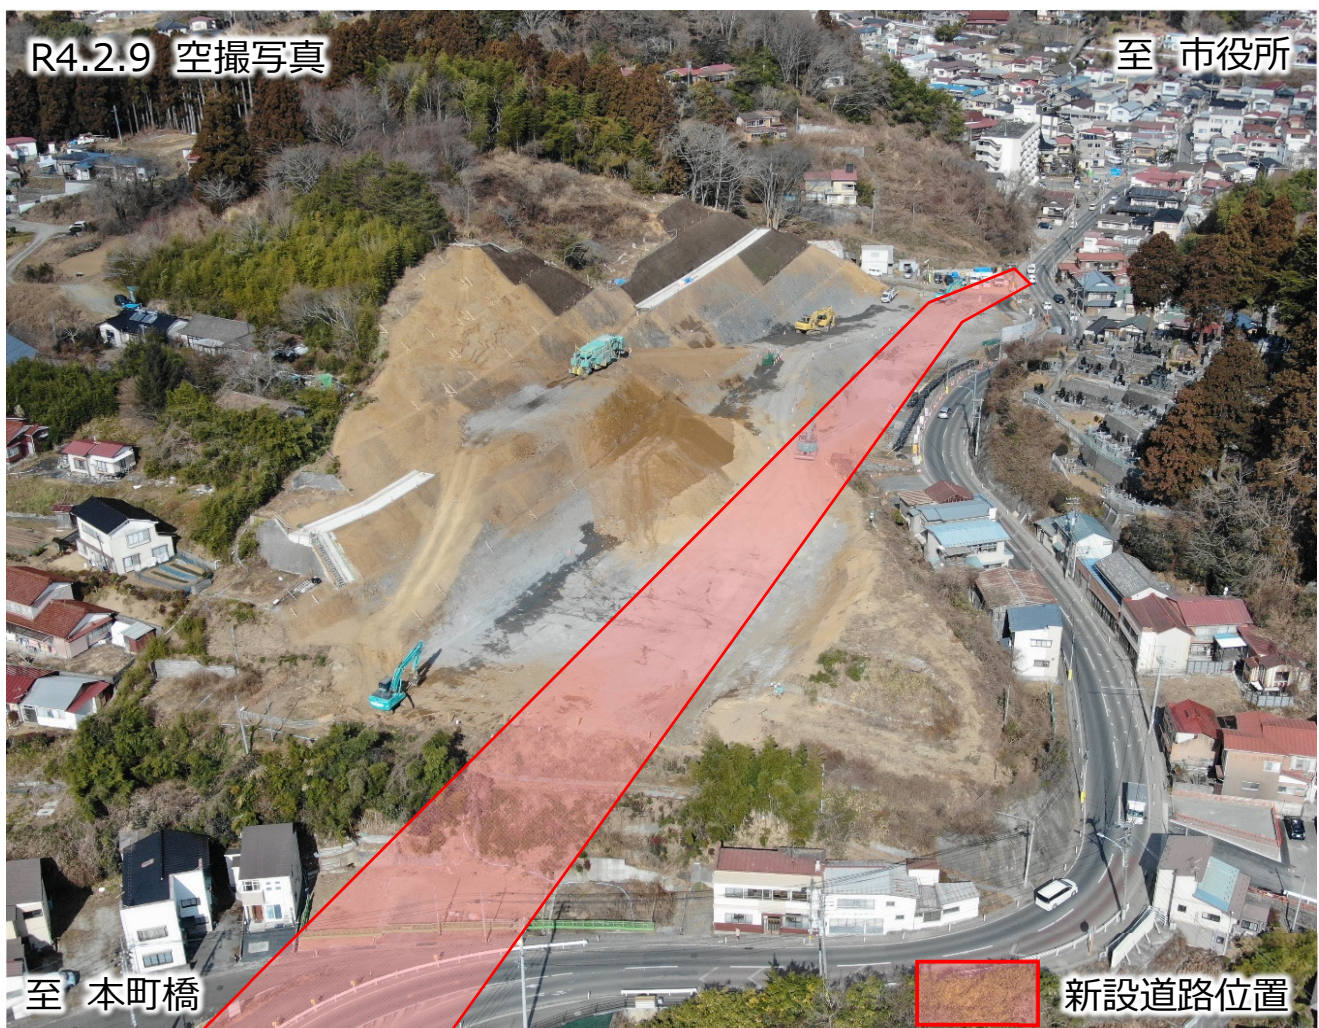

【平面図】

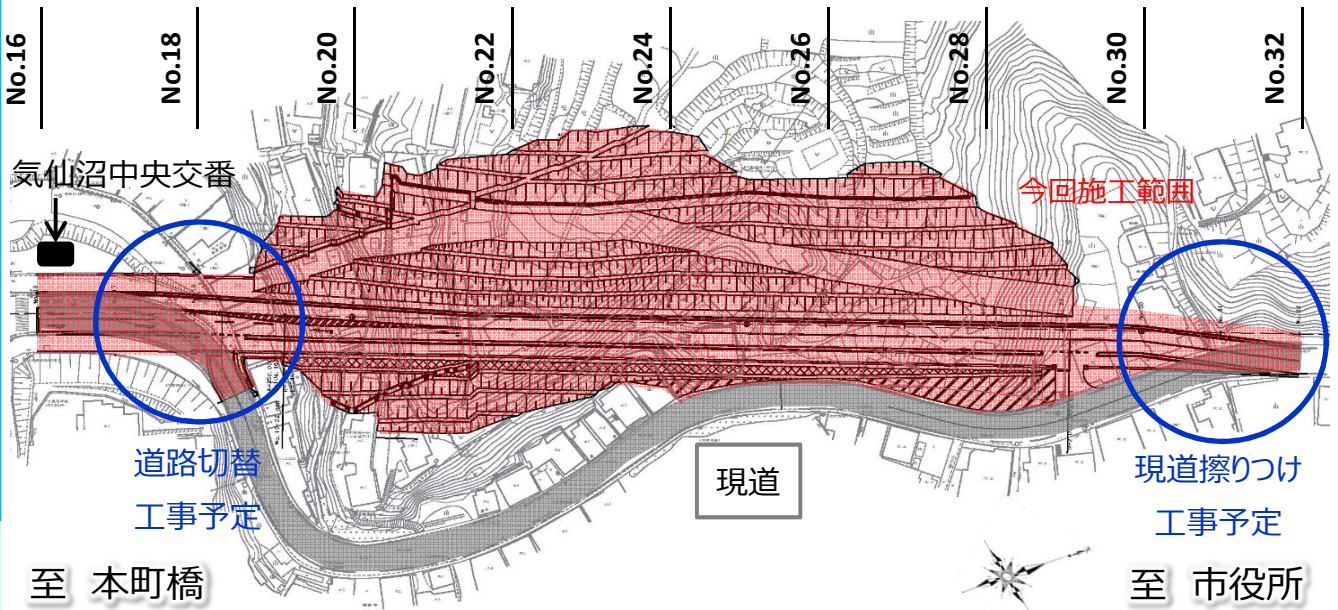

【標準横断図 (No.22)】

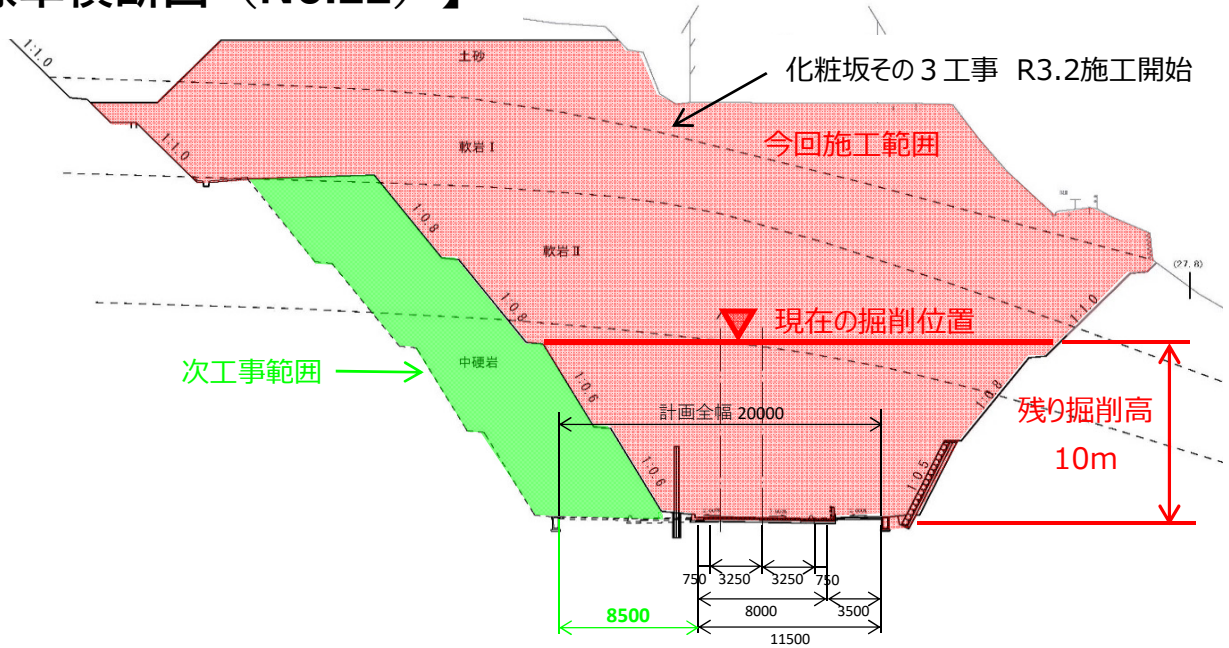

標準横断図の赤線が現在の掘削位置で残りの掘削高は10mになります。今回工事により道路の幅員は車線+歩道の11.5mとなります。なお、暫定供用以降予定している次工事では、さらに幅員が8.5m広がり、将来的には全幅20.0mとなる予定です。平面図の青丸部が現道との擦りつけ、および切替を行う箇所となります。

宮城県気仙沼土木事務所

〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢4 7 番地 6

電話：0226-24-2546

E-mail：ksdbkdk1@pref.miyagi.lg.jp

ホームページ：http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ks-doboku/

