

東部土木復旧・復興だより 第11号

平成26年7月15日発行
宮城県東部土木事務所



1. 災害復旧事業の進捗状況(平成26年6月末現在)

当事務所管内の災害復旧事業の着手率は、道路及び河川関係を合わせて箇所ベースで約91%、金額ベースで約55%となっています。

工種	事業箇所数			着手率	完了率	工種	事業費(億円)			着手率	完了率
	全体	事業中	うち完了				全体	事業中	うち完了		
道路関係	591	546	459	92.4%	77.7%	道路関係	482	228	149	47.3%	30.9%
河川関係	63	51	17	81.0%	27.0%	河川関係	1,279	733	141	57.3%	11.0%
合計	654	597	476	91.3%	72.8%	合計	1,761	961	290	54.6%	16.5%

2. 事務所復旧・復興トピックス

7月9日に根本復興大臣と谷復興副大臣が管内を視察に訪れました。



■女川町中心部の視察状況

平成26年7月9日に根本復興大臣と谷復興副大臣が管内を視察に訪れました。

女川町では、応援派遣職員を激励された後、中心部のまちづくり状況を視察されました。

石巻市では雄勝硯生産販売協同組合、郷土料理の魅力発信に取り組む「雄勝スターズ」、旧桑浜小学校廃校利用プロジェクト、大川地区農地復旧事業を視察されました。

東松島市では社会的孤立防止ソーシャルファーム事業、小松谷地地区災害公営住宅、大曲浜地区移転元土地利用促進事業、営農型太陽光発電による被災地農村を元気にする事業、野蒜北部丘陵地区土地区画整理事業を視察されました。



■「雄勝スターズ」での試食



■野蒜北部丘陵地区土地区画整理事業の視察状況

3. 道路災害復旧事業関係

当事務所管内の県管理道路の災害箇所は591箇所、これまでに546箇所に着手し、459箇所が完了しました。

○コバルトラインの全面通行止めが解除されました。

(一) 牡鹿半島公園線(通称:コバルトライン)については、これまで、大原跨道橋から山鳥規制ゲートまでの延長約11kmを全面通行止めとしていましたが、平成26年4月30日(水)午後1時より全面通行止めを解除しました。

これにより、牡鹿半島の復旧・復興が加速するとともに、観光客誘致が図れるなど地域振興に寄与できると考えています。

なお、通行再開後も災害復旧工事が継続しており片側交互通行になる箇所がありますので、ご注意ください。



○橋梁工事の安全祈願祭を開催しました。

(1) 定川大橋の災害復旧工事を平成28年度末完成を目標に本格着手します。

本体工事の前段として旧橋の撤去工事が始まるに当たり、平成26年5月14日に安全祈願祭を開催し、参加者全員で工事の安全を祈願しました。



【定川大橋上流右岸側より撮影】

(2) 新北上大橋は、現在、仮設橋にて供用していますが、平成27年度末完成を目標に本復旧工事に着手するに当たり、工事の安全と北上地域の日も早い復興を祈念し、平成26年6月13日に安全祈願祭を開催しました。



○道路災害復旧工事の完成状況



【(国)398号
石巻市渡波地内】



【(国)398号
石巻市鹿妻南地内】



【(主)女川牡鹿線
女川町横浦(2)地内】



【(主)女川牡鹿線
女川町横浦(3)地内】



【(主)女川牡鹿線
女川町横浦(6)地内】



【(主)女川牡鹿線
女川町高白浜(3)地内】

4. 河川・海岸災害復旧事業関係


当事務所管内の県管理河川・海岸の災害箇所は63箇所、これまでに51箇所に着手し、17箇所で完了しました。

○河川工事の安全祈願祭を開催しました。

- (1) 北上運河河川災害復旧工事については、全4工区全てが工事発注となり、平成27年度末の完成を目標に工事を進めて行く予定です。
平成26年6月19日、北上運河河川災害復旧工事(その3)の着手にあたり、安全祈願祭を開催し、参加者全員で工事の安全を祈願しました。



(2) 皿貝川は、石巻市の旧河北町と旧北上町にまたがる高津森(標高419.1m)に源を発し、山間部を南流して平地に出て石巻市北上町釜谷崎地先で、月浜第一水門を経て北上川に合流する流域面積31.63km²、流路延長約11kmの一級河川です。皿貝川河川災害復旧工事(その1)の着手にあたり、平成26年7月2日に、工事の安全と北上地域・河北地域の日も早い復興を祈念し、安全祈願祭を開催しました。皿貝川の復旧が地域住民の皆様にとっても安全・安心な町づくりとなるよう鋭意工事を進めていきます。

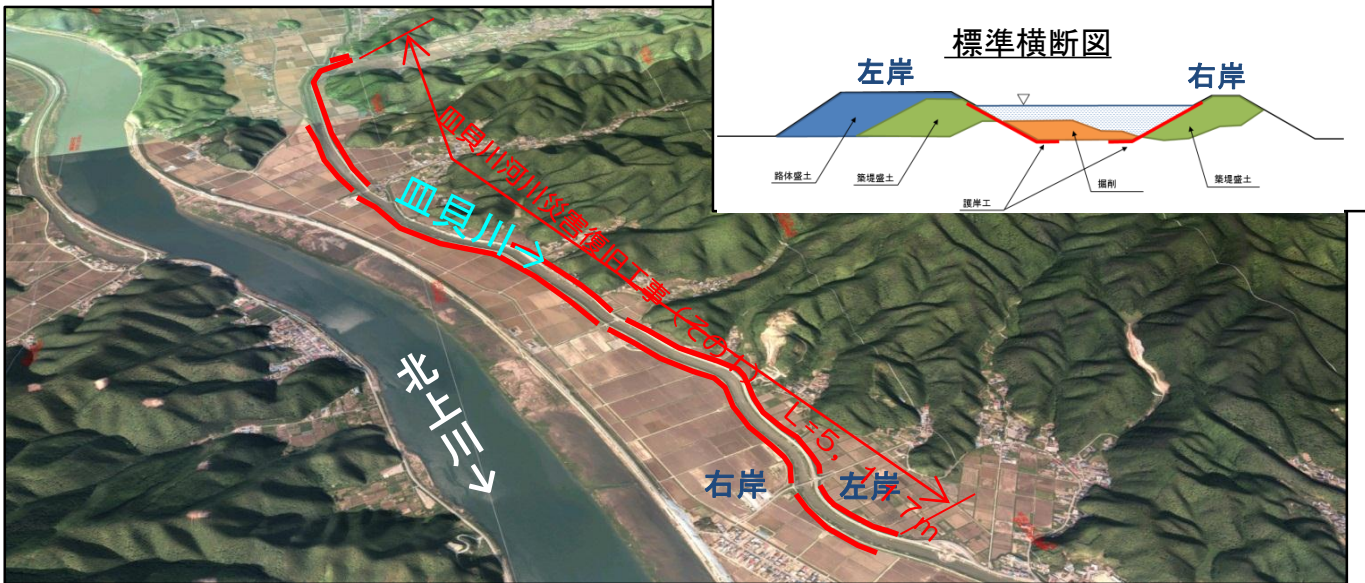

○河川・海岸災害復旧事業の工事状況



【北上運河の右岸築堤盛土完了状況】



【真野川の鋼矢板打設工事状況】



【白浜地区海岸の擁壁工事状況】



【追波川の築堤盛土工事状況】


5. 復興道路事業関係

○高盛土道路の門脇流留線に丁張りを設置しました。

都市計画道路 門脇流留線は、石巻市街地沿岸部において、石巻市門脇地区・湊地区・渡波地区とを連絡する主要幹線として計画される道路です。

本事業のうち、湊～渡波地区の魚町工区での計画は、現在の県道である一般県道 石巻女川線の道路幅の中に高盛土道路を設置するものであり、今年度からの工事着工を目指し事業を進めております。

魚町工区の盛土高さは現地盤高から約3.5mとなるTP+4.5以上で整備することとしており、見える復興の一環として、具体的な位置や完成後の道路幅や高さを示す丁張りを2カ所設置しました。年内には工事を発注し、本格着手する予定です。

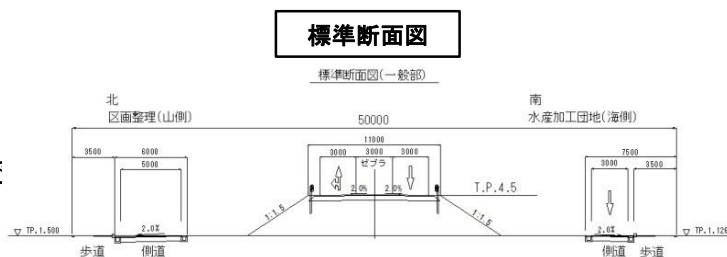

6. 他県からの応援職員



道路建設第1班

鹿児島県から応援に来ていただいた大津さんには4月から6月末までの3ヶ月間、宮城県の復旧・復興のためにご協力いただきました。

本当にありがとうございました。

これからも一刻も早い復旧・復興を目指して、職員一丸となって頑張っていきます。

○問い合わせ先 宮城県東部土木事務所 企画担当チーム

TEL:0225-95-1151

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-dbk/>

E-mail: et-dbk@pref.miyagi.jp
