




仙台塩釜港復興だより 第30号

－港湾は人の心も結んでいます－

復興事業（新規防潮堤整備等）の進捗状況

仙台塩釜港湾事務所では、現在、東日本大震災からの復興事業として新規防潮堤整備を進めています。全体延長14.4kmのうち14.0kmが完成しており、残る0.4kmについても令和4年度中の完成に向け事業を進めています。

また、仙台港区では、臨港地区外への貨物流出防止を目的とした津波漂流物対策施設の整備も併せて行い、令和4年3月までに全体延長4.7kmの全てが完成しました。

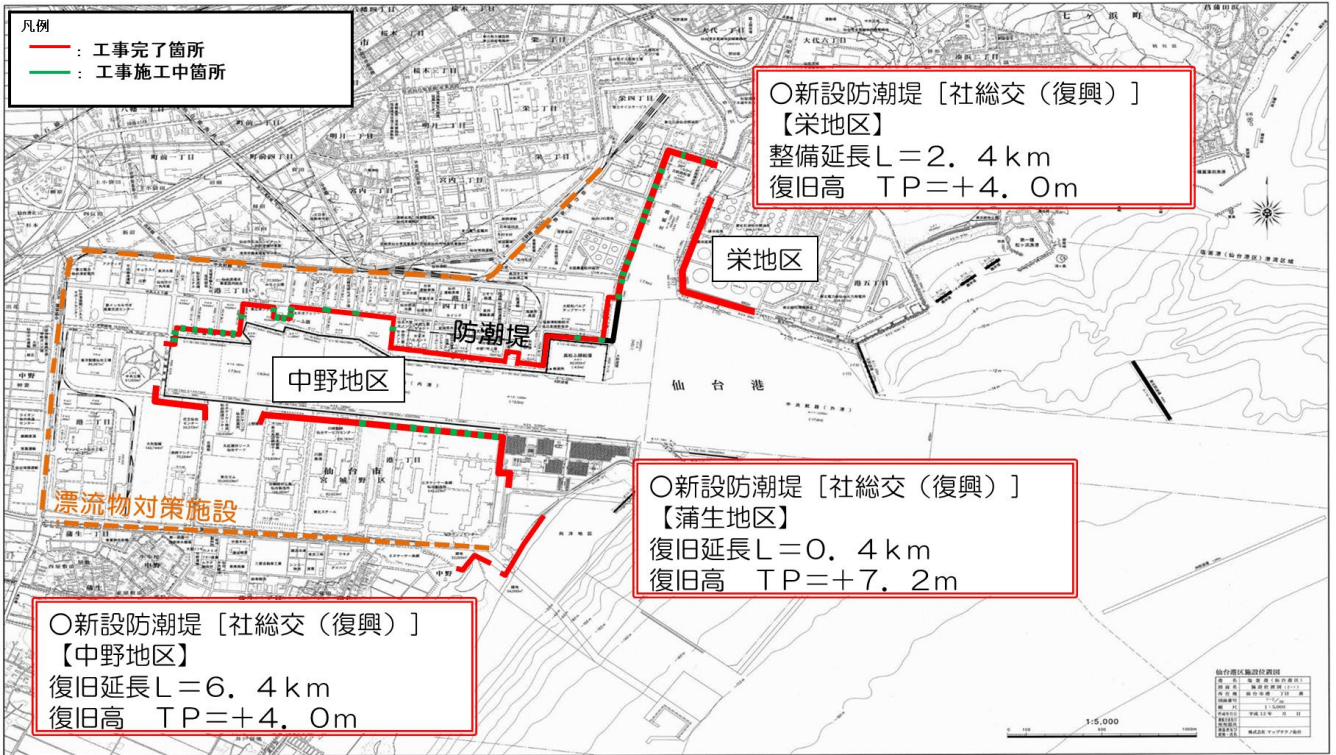

（令和4年6月末時点）

| | | 全体延長 | 完成延長 | 残延長 | 完成率 |
|------|---------|------|------|------|-----|
| | | (km) | (km) | (km) | (%) |
| 仙台港区 | 防潮堤 | 9.2 | 8.8 | 0.4 | 96 |
| | 漂流物対策施設 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 100 |
| 塩釜港区 | 防潮堤 | 5.1 | 5.1 | — | 100 |
| 松島港区 | 防潮堤 | 0.1 | 0.1 | — | 100 |
| 合計 | 防潮堤 | 14.4 | 14.0 | 0.4 | 97 |
| | 漂流物対策施設 | 4.7 | 4.7 | 0.0 | 100 |

復興事業の状況

【栄地区】 栄西地区防潮堤工事

[着手前]



[完成]



【栄地区】 栄西地区防潮堤（陸閘）工事（その1）

[着手前]



[完成]



【栄地区】 栄西地区防潮堤（陸閘）工事（その2）

[着手前]



[施工中]



【栄地区】 区栄西地区防潮堤（陸閘）工事（その2）

[着手前]



[施工中]



【中野地区】 仙台港区防潮堤陸閘外（その4）工事

[着手前]



[施工中]



【中野地区】 仙台港区防潮堤陸閘外（その4）工事

[着手前]



[施工中]



【中野地区】 仙台港区防潮堤陸閘外（その5）工事

[着手前]



[施工中]



【中野地区】 仙台港区防潮堤陸閘外（その5）工事

[着手前]



[施工中]



【中野地区】 中野南地区外防潮堤工事

[着手前]



[完成]



【中野地区】 中野南地区外防潮堤工事

[着手前]



[完成]



【漂流物対策施設】 津波漂流物対策設置工事（その7）

[着手前]



[完成]



【漂流物対策施設】 津波漂流物対策設置工事（その8）

[着手前]





[完成]



災害復旧事業（令和3年福島県沖地震等）の進捗状況

事務所管内では、令和3年2月13日に発生した福島県沖地震により被災した公共土木施設の災害復旧工事（19箇所）を進めています。

また、令和4年3月16日に発生した福島県沖地震による公共土木施設の被災箇所（5箇所）については、令和4年5月に災害査定を行い、令和3年の災害復旧工事と併せて工事を進めています。

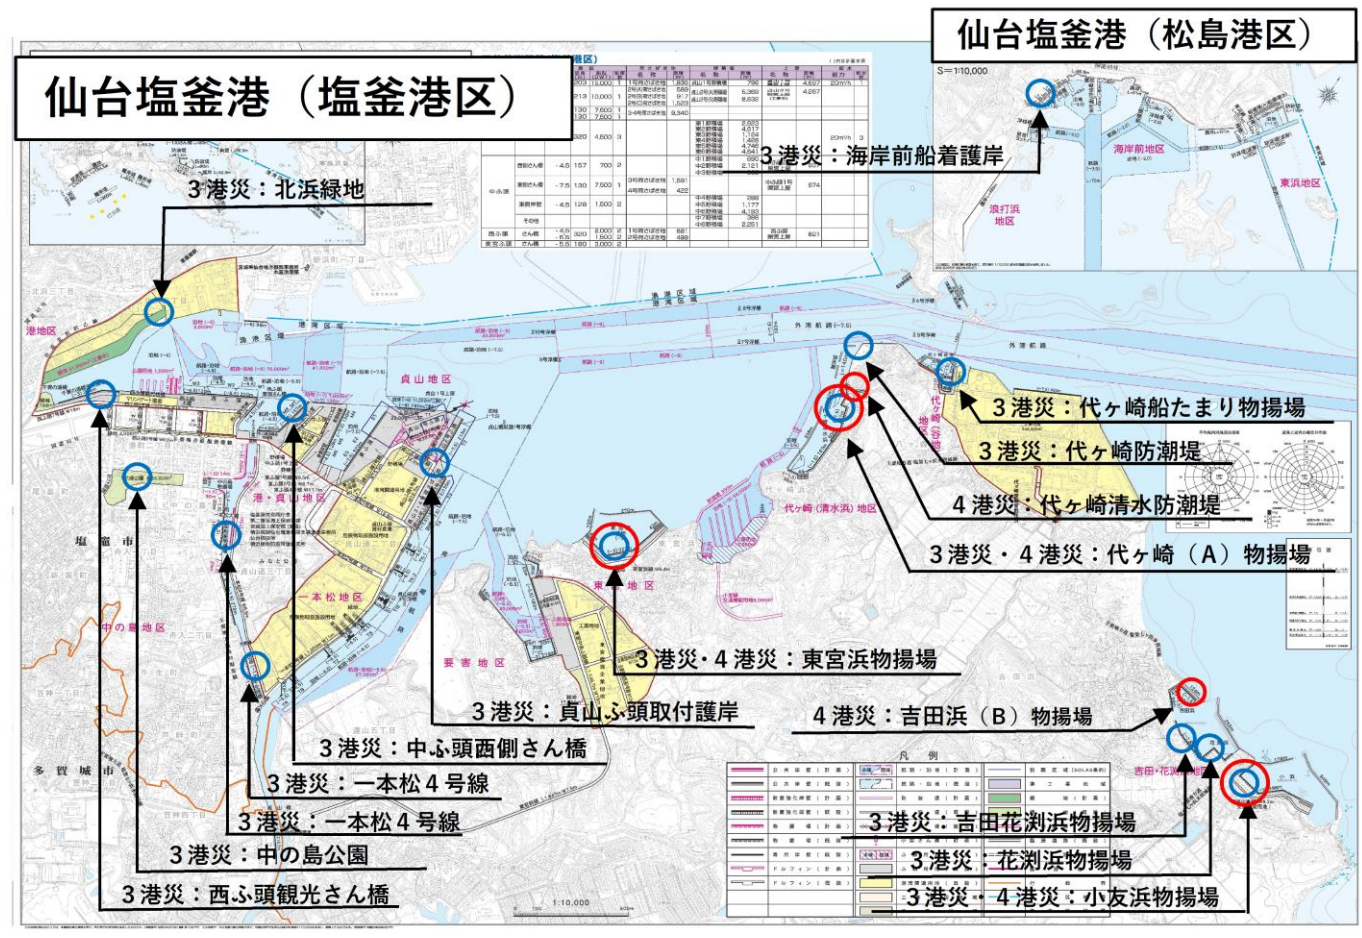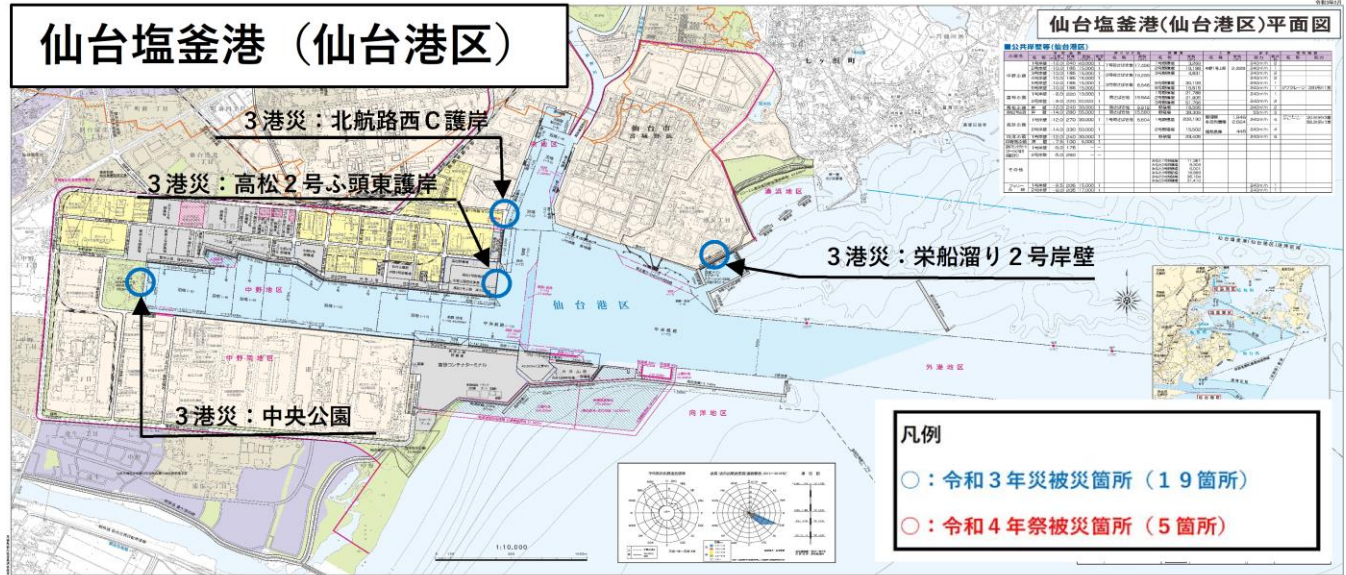

| | 被災箇所数 | 着手率 (%) | 完成率 (%) | 令和3年災 | | | 令和4年災 | | |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 箇所数 | うち着手箇所 | うち完成箇所 | 箇所数 | うち着手箇所 | うち完成箇所 |
| 仙台港区 | 4 | 100 | 25 | 4 | 4 | 1 | | | |
| 港湾施設 | 3 | 100 | 33 | 3 | 3 | 1 | | | |
| 公園・緑地等 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 塩釜港区 | 19 | 95 | 26 | 14 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| 港湾施設 | 15 | 100 | 33 | 11 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 海岸保全施設 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 公園・緑地等 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |
| 松島港区 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 海岸保全施設 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |
| 合計 | 24 | 96 | 25 | 19 | 19 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 港湾施設 | 18 | 100 | 33 | 14 | 14 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 海岸保全施設 | 3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 公園・緑地等 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

【仙台港区】中央公園

[着手前]



[施工中]



【塩釜港区:塩竈市】(一本松4号線)

[着手前]



[施工中]



【塩釜港区:七が浜町】小友浜物揚場

[着手前]



[施工中]



【松島港区】海岸前船着護岸

[着手前]



[施工中]





仙台港区高砂コンテナターミナル拡張事業の進捗状況

令和3年のコンテナ取扱貨物量は、世界的な新型コロナウイルス感染症の影響を受け、対前年度比約2%減の26.5万TEUとなる見込みです。

一方、コンテナ貨物取扱量の増加に伴う高砂コンテナターミナル拡張工事（約21ha→約27ha）は、令和4年3月までに大型照明塔設置（2基）や空コンゲート建築（5ゲート）などが完了しました。


引き続き、早期の完了を目指し、空コンゲート舗装や食検検査場などの整備を推進しています。

コンテナ貨物取扱量の推移

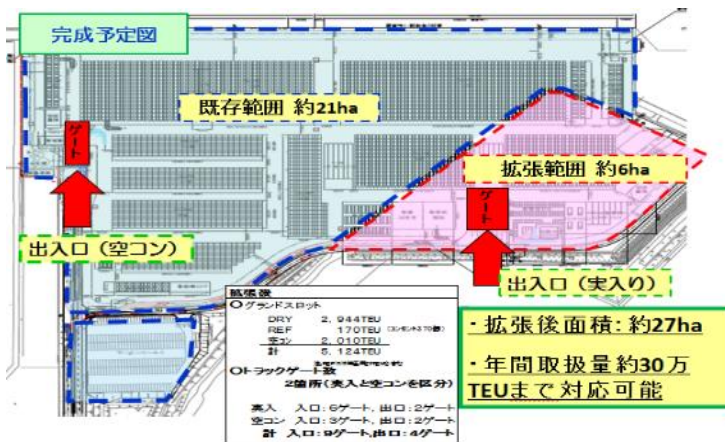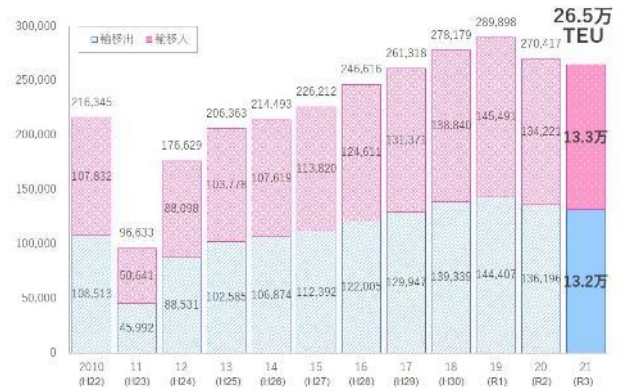


また、向洋地区ふ頭再編改良事業[高砂3号岸壁(-14m×190m)、ふ頭用地造成4ha]については、現在、塩釜港湾・空港整備事務所(国交省)がケーソンの製作・据付などを進めています。

令和4年度は、県事業として背後の埋立造成やガントリークレーン整備を進めるとともに、給水・給電設備および大型照明塔の整備も着手し、令和6年度からの供用開始を目指し事業を推進します。

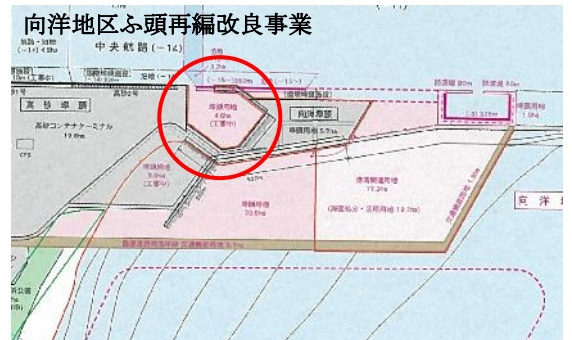

R3.3.3 撮影(GC3号機より)



R4.3.11 撮影



水門・陸閘自動閉鎖システムの運用状況

仙台塩釜港(仙台港区)の一部が完成したことから、令和4年3月28日(月)に仙台港1エリア(7基)及び仙台港4エリア(2基)の計9基の陸閘について運用を開始しました。

これにより、当所が管理する水門・陸閘自動閉鎖システム全52基のうち、水門・陸閘40基の運用を開始しました。残る仙台港区の陸閘12基についても、令和4年度内の運用開始に向け整備に取り組んでいきます。

■水門・陸閘自動閉鎖システム運用状況

令和4年3月末現在

| 港区名 | 地区名 | エリア | 全体(基) | 水門・陸閘別 | 供用済(基) | 未供用(基) |
|---------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|
| 仙台港区 | 中野 | 仙台港1 | 4 | 陸閘 | — | 4 |
| | | 仙台港2 | 7 | 陸閘 | 7 | — |
| | | 仙台港3 | 8 | 陸閘 | — | 8 |
| | | 仙台港4 | 2 | 陸閘 | 2 | — |
| 塩釜港区 | 海岸通・港町 | 塩釜港1 | 1 | 陸閘 | 1 | — |
| | | 塩釜港2 | 5 | 陸閘 | 5 | — |
| | | 海岸通水門エリア | 1 | 水門 | 1 | — |
| | 中の島・貞山通 | 塩釜港3 | 1 | 陸閘 | 1 | — |
| | | 塩釜港4 | 5 | 陸閘 | 5 | — |
| | | 塩釜港5 | 8 | 陸閘 | 8 | — |
| | 要害浦 | 七ヶ浜1 | 4 | 陸閘 | 4 | — |
| | 東宮・代ヶ崎浜 | 七ヶ浜2 | 1 | 陸閘 | 1 | — |
| | 代ヶ崎浜 | 七ヶ浜4 | 1 | 陸閘 | 1 | — |
| 花刈浜・吉田浜 | 七ヶ浜5 | 4 | 陸閘 | 4 | — | |
| 計 | | | 7地区 | | 7地区 | 0地区 |
| | | | 14エリア | | 12エリア | 2エリア |
| | | | 52基 | | 40基 | 12基 |

※エリア：制御局1つで受け持つことができる区域

◎水門・陸閘自動閉鎖システムの遠隔操作状況



仙台塩釜港湾事務所内



津波注意報等発令時の代替事務所の状況

※仙台土木事務所内



■中野地区 N=9 基(仙台港区)

■水門・陸閘全体(動力別)の運用状況

令和4年3月末現在(単位:基)

| | 自動化 | 電動 | 人力 | 計 |
|-----|-----|-----|------|-----|
| 供用済 | 40 | 45 | 33 | 118 |
| 工事中 | 12 | 28 | 0 | 40 |
| 全体 | 52 | 73 | 33 | 158 |
| 進捗率 | 77% | 62% | 100% | 75% |

編集事務局

宮城県仙台塩釜港湾事務所 企画担当チーム

〒983-0001 仙台市宮城野区港三丁目1-3 仙台港国際ビジネスサポートセンター5階

TEL: 022-254-3131 FAX: 022-254-3136

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgkown/> E-mail: sdsgkown@pref.miyagi.lg.jp
