


【日向貝地先海岸災害復旧工事】進捗状況


事業概要

復旧延長 L=285m
 護岸工 直立堤(H=3.6m ~ H=2.5m) L=164m
 荷捌棧橋 N=1箇所 斜路工(胸壁工) L=25.9m
 樋管工 L=52m 階段工 N=1箇所 消波工 N=271個

計画平面図

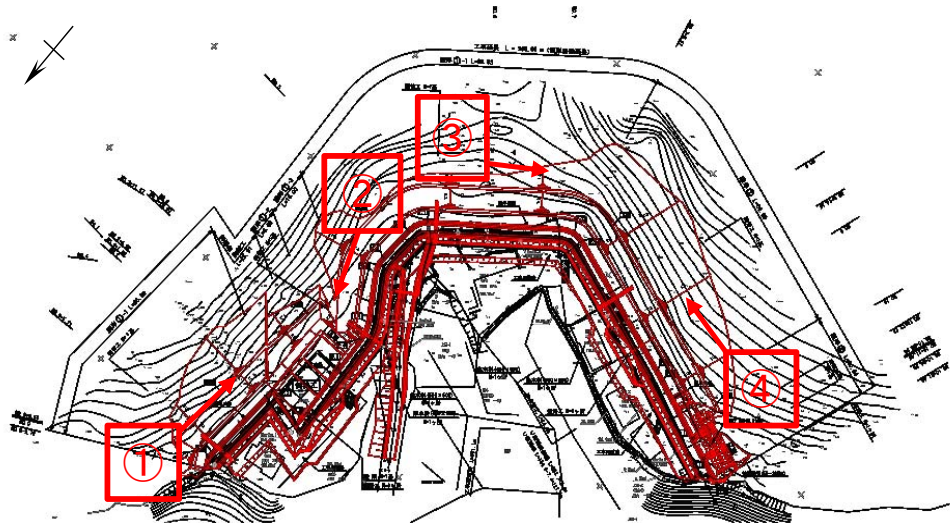

計画横断図

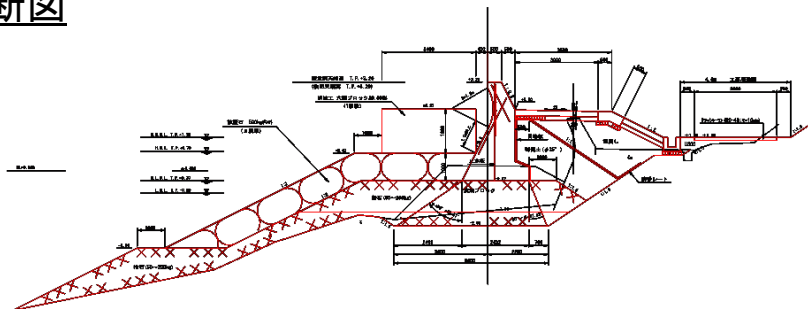

事業位置



日向貝地先海岸

気仙沼市 唐桑町西舞根地先

① 着手前 平成26年8月



② 着手前 平成26年8月



③ 着手前 平成26年8月



④ 着手前 平成26年8月



【日向貝地先海岸災害復旧工事】進捗状況

進捗状況

平成29年10月完成

① 平成29年10月完成



護岸工(東側)

② 平成29年10月完成



護岸工(東側)

③ 平成29年10月完成



護岸工(中央部)

④ 平成29年10月完成



護岸工(西側)
