

# 【気仙沼海岸 最知地区海岸】 進捗状況

## 事業概要

復旧延長 L=731.6m

重力式護岸工(H=7.2m)

コンクリート工


突堤工

L=731.6m

V=23,403m<sup>3</sup>

N= 1箇所

## 計画平面図

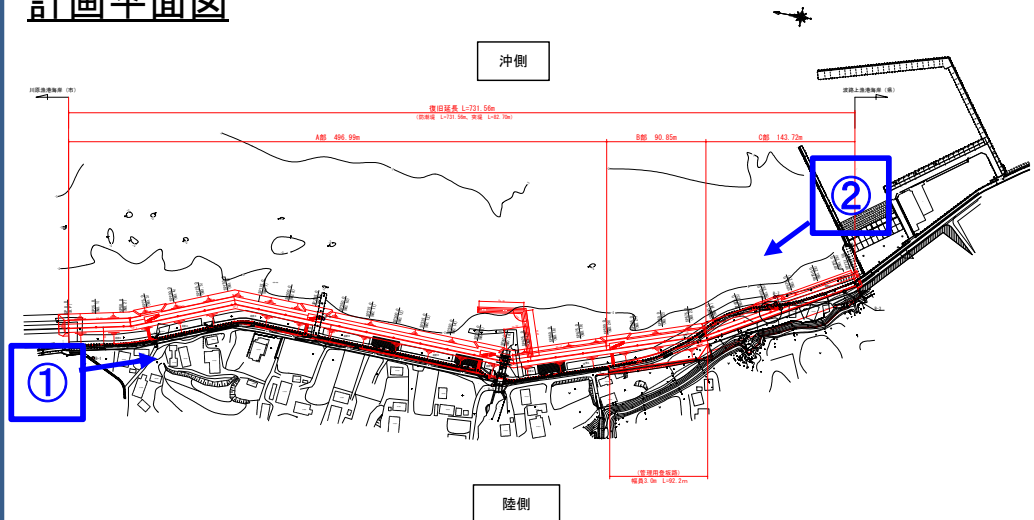

## 事業位置



気仙沼海岸最知地区海岸  
気仙沼市最知森合地先

## ① 着手前 平成26年7月

起点側(北側)




## ② 着手前 平成26年7月

終点側(南側)



## 計画横断図

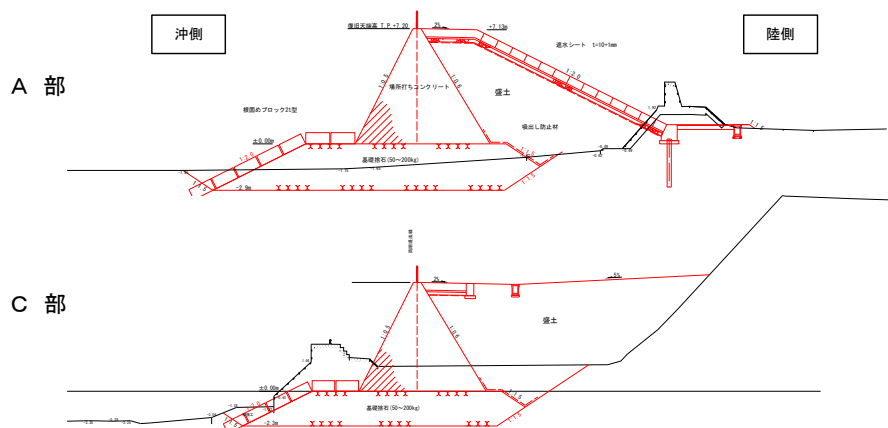

# 【気仙沼海岸 最知地区海岸】 進捗状況

## 進捗状況

平成31年3月 完成

### ① 平成31年3月 完成



### ② 平成31年 3月 完成

