

令和4年度 迫川流域下水道事業

宮城県東部下水道事務所

事業箇所処理区域名	迫川流域下水道			流入量
	全体計画	認可計画	R2年度末(実績)	
行政人口(人)	47,300	128,089	62,314	
計画処理面積(ha)	2,186.7	1,795.5	1,452.9	
計画処理人口(人)	24,400	26,163	28,754	
計画処理水量(m ³ /日)	12,026	12,405		R2日平均
処理能力(m ³ /日)	14,475	14,475	9,650	6,946
系列数	3	3	2	
管渠延長(m)	55,470	55,470	55,470	
放流渠延長(m)				
ポンプ場(箇所)	10	10	10	
事業期間	H5~R17	H5~R7		
事業費(億円)	442	359	343	
処理場名	石越浄化センター			
所在地	登米市石越町東郷			
敷地面積(ha)	7.20			
処理方式	オキシデーションディッチ法			

(目的)

栗原市(旧 築館町・若柳町・栗駒町・一迫町・鶯沢町・金成町・志波姫町・花山村)及び登米市(旧石越町)の2市を対象に生活環境の改善並びにラムサール条約指定湖沼である伊豆沼・内沼及び迫川等の公共用水域の水質保全を図る。


(事業経過)

平成5年度 事業計画策定、都市計画決定、事業着手
 平成12年度 7月に供用開始(築館町、志波姫町、若柳町、石越町)
 平成14年度 一迫町、金成町供用開始
 第2系列供用開始
 平成15年度 幹線管渠全区間完成、栗駒町供用開始


令和3年度事業概要(実績)
 【補助事業(交付金事業)】
 事業費 C=146百万円

令和4年度事業概要
 【補助事業(交付金事業)】
 事業費 C=117百万円
 (うち令和3年度繰越分
 C=24百万円)

迫川流域下水道

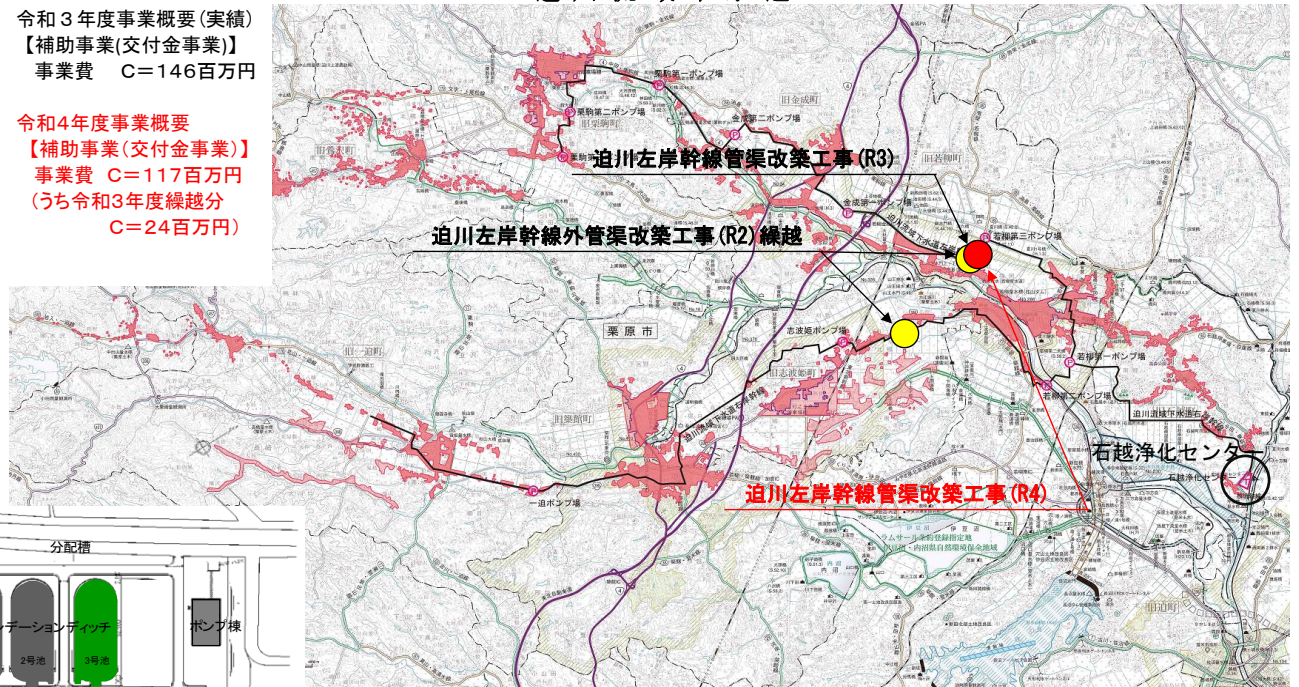

石越浄化センター一般平面図

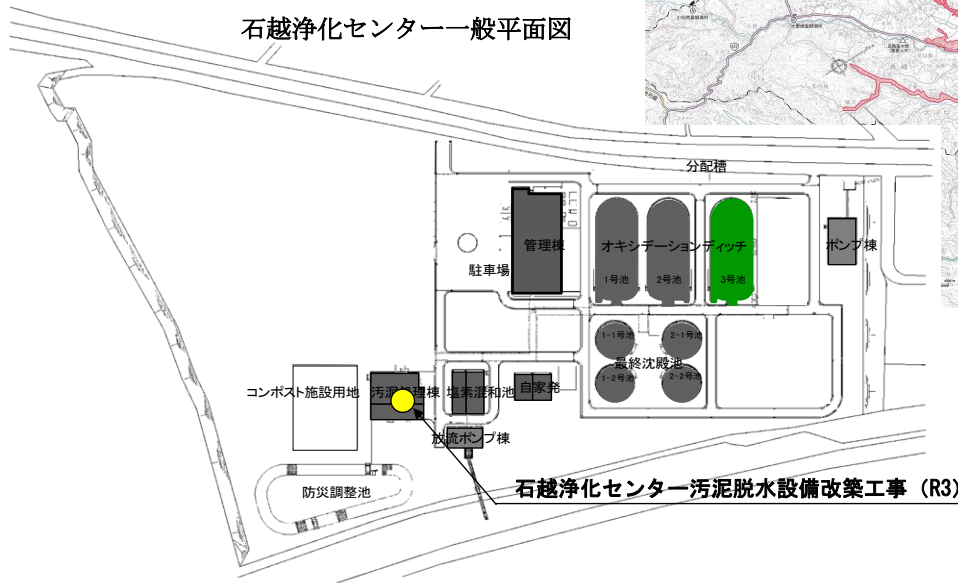

図例	計画区域	
-----	行政区区域界	
■ (Black)	設 備 渠	
■ (Yellow)		R2年度まで施工済み
■ (Red)		R3年度(実績)
■ (Green)	R4年度(実施予定)	
■ (White)	全体計画	
P	ポンプ場	
T	終末処理場	
