川内沢ダム建設事業の付替市道　進捗状況

令和３年６月３０日現在

道路改良工事
(株)宮城林産
R2.10.1～R3.6.30
【完成】

道路改良工事（7 号橋～8 号橋区間）

伐木作業中

道路改良工事（その２）②
(株)橋本店
R3.3.9～R3.12.28
【進捗率 6%】

8 号橋下部工工事
(株)環境施設
R3.6.17～R4.1.31
（R3.6.16 日契約）

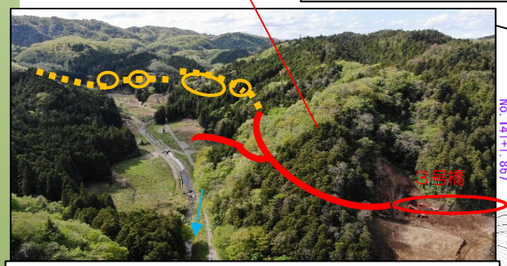

道路改良工事（3 号橋～現道）

川内沢ダム建設事業全体平面図

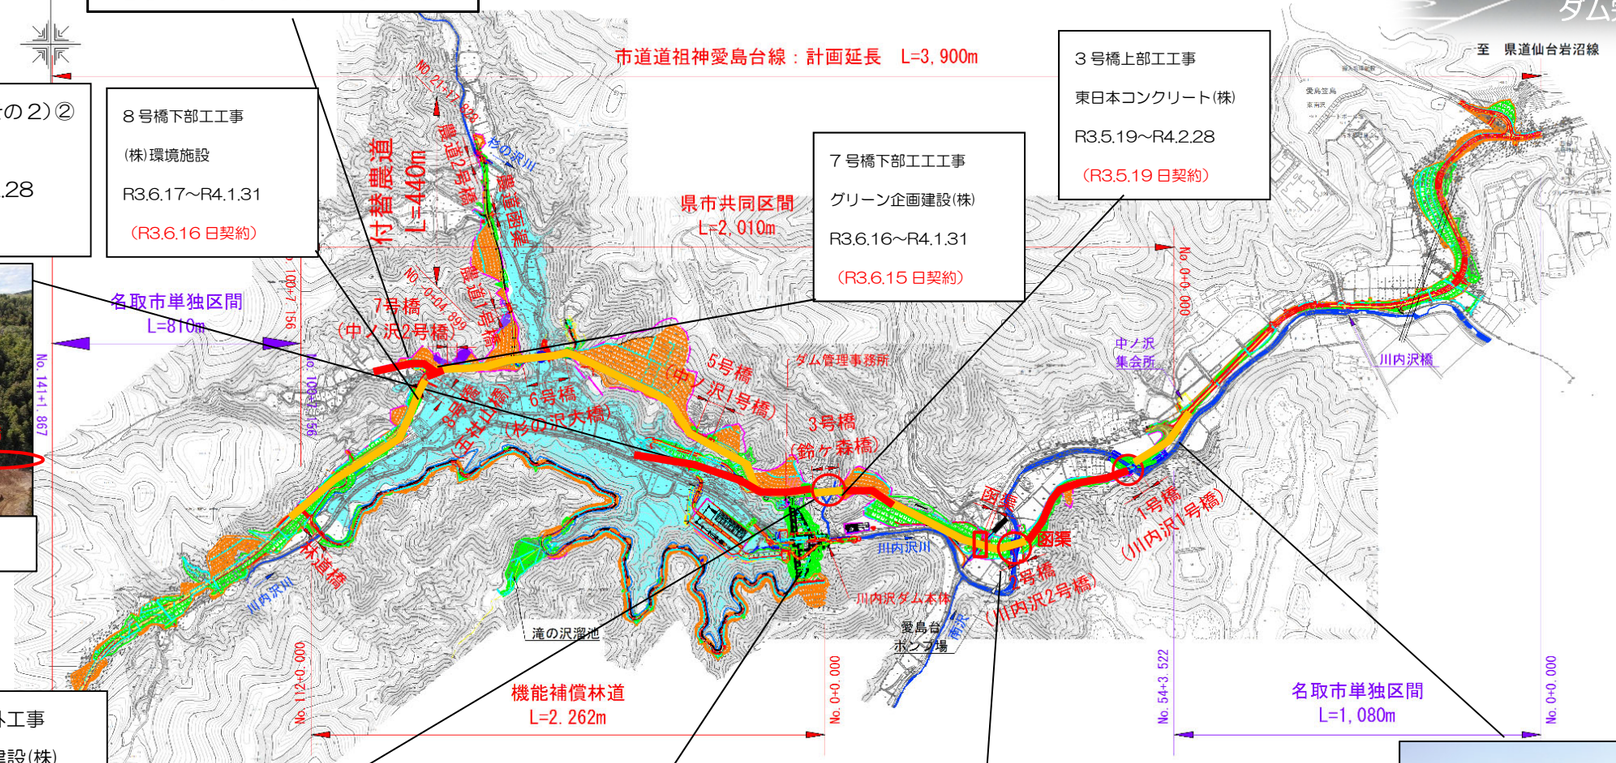

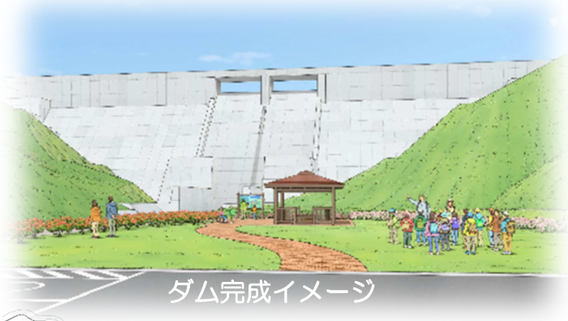

ダム完成イメージ

３号橋上部工工事
東日本コンクリート(株)
R3.5.19～R4.2.28
（R3.5.19 日契約）

７号橋下部工工事
グリーン企画建設(株)
R3.6.16～R4.1.31
（R3.6.15 日契約）

３号橋下部工
コンクリート打設中

３号橋下部工外工事
グリーン企画建設(株)
R2.10.9～R3.9.30
【進捗率６６%】

道路改良工事（その２）①
(株)橋本店
R3.3.9～R3.12.28
【進捗率 6%】

３号橋下部工・道路改良工事（２号橋～３号橋区間）

ダム建設位置

函渠工工事
グリーン企画建設(株)
R3.2.18～R3.11.30
【進捗率１５%】

付替市道　L=2,010m
【施工中】　道路改良工事
橋梁工事
函渠工工事

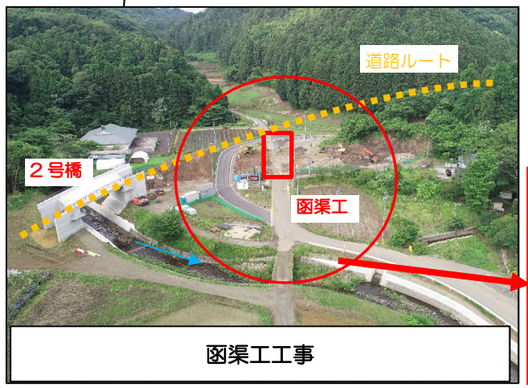

函渠工工事

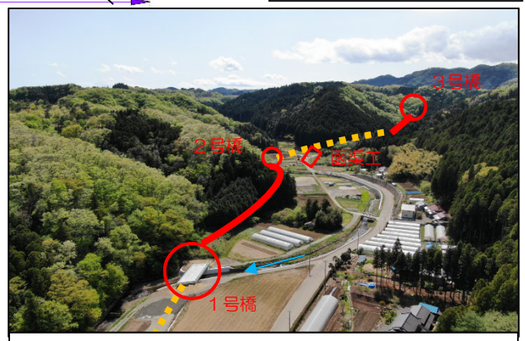

道路改良工事（1 号橋～2 号橋区間）

迂回路設置
