

東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップの見直しについて

I 見直し主旨

農地復旧区域の精査，各種関連事業との進捗調整や市町の復興計画等との協議・調整などが進むとともに，新たに取り組む東日本大震災復興交付金（以下，「復興交付金」という）を活用した農地整備事業と一体的に施行する地域もあることから，平成24年1月31日に公表したロードマップを精査し，見直すもの。

II 見直しの内容

- ① 復旧復興ロードマップについて，基本的に
 - ・ 農地・農業用施設の復旧は平成25年度の完了を目標，
 - ・ 農地海岸堤防の復旧については，まちづくりと関係する箇所があることから，平成27年度の完了を目標としつつ
 - ・ 復興交付金を活用し，新たに取り組む農地整備事業については，平成27年度完了としていたところ。

- ② 今回，主に次の観点から復旧復興の工程を精査し，関係市町等の関係機関を始め，地元関係者との協議を行い，ロードマップを見直した。
 - ・ 平成25年度以降の工程の可能な限りの前倒し
 - ・ 他の機関が実施する堤防復旧等の工程を考慮
 - ・ 他の事業者が検討している事業により農地転用が想定される地区への対応
 - ・ 復興交付金を活用した農地整備事業との一体的施工への対応
 - ・ 復興交付金を活用した農地整備事業による土地利用整序化の合意形成への対応等

- ③ その結果，表1のとおり，農地及び農業用施設については，平成25年度以降の工程を平成24年度までに可能な限り前倒しして実施する一方，一部の工区・施設について他の機関等との調整により，平成26年度から27年度に実施する計画とした。

(表1)

農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップ

工種	平成23年度 (※1)	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	備考
■農地(除塩含む)	本復旧					
面積:13,000ha(※2)	5,780ha	4,800ha	1,270ha	990ha	160ha	
進捗率(%)	44%	81%	91%	99%	100%	
■主な農業用施設	仮復旧	本復旧				
排水機場:47施設 (※3)	4施設	26施設	16施設	1施設		
進捗率(%)	9%	63%	97%	100%		
■農地海岸	仮復旧	本復旧				
農地海岸:94箇所 (※4)	5箇所	31箇所	29箇所	23箇所	6箇所	
進捗率(%)	5%	38%	69%	94%	100%	
■農山漁村地域復興基盤総合整備 (復興交付金を活用した農地整備事業)	農地整備(土地利用の整序化含み)					
面積:約4,000ha(※5)						
・土地改良 法手続 <small>当初事業計画 事業計画変更 (必要に応じて)</small>						
・工事						
・換地						
・面積 約4,000ha	0ha	0ha	800ha	1,570ha	1,630ha	
進捗率(%)	0%	0%	20%	59%	100%	

※1 平成23年度は実績で標記。

※2 農地復旧面積には、国が仙台市において直轄特定災害復旧事業で実施するもの及び自力復旧、他省庁事業による復旧、復興事業等による転用などの面積を含む。

※3 受益面積が10ha以上の県が復旧する排水機場(国が事業主体として復旧する15機場を除く。)

※4 県が復旧する農地海岸(国が特定災害復旧等海岸工事で復旧する亘理・山元農地海岸地区の3海岸を除く。)

※5 農地復旧面積の13,000haのうち、津波等被害が著しい未整備の農地を中心として復興交付金を活用して県が実施するものであり、農地整備面積には現在調査中の地域も含まれ、変更の可能性がある。また、このほか、国が仙台市において直轄農用地災害復旧関連区画整理事業で約2,000haを実施予定。

(参考1) 被害の概要

東日本大震災による農地・農業用施設の被害額は約3,973億円, 農業集落排水施設等生活環境施設の被害額は約269億円, 農地海岸保全施設の被害額は435億円で, 合計約4,677億円である。(調査中:平成25年1月10日現在)

(参考2) 災害査定の概要

県内の被災市町及び土地改良区からの要請を踏まえて, 計2,449件の災害査定を受け, 1,160億円の復旧事業費(県営・団体営)が確定。

このほか, 農林水産省が直轄で7地区(特定災害復旧等海岸工事を含む)10事業, 約930億円を実施。


(参考3) 復興交付金を活用した新たな農地整備事業の概要

(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)

- ・ 農地整備事業: 4市2町 8地区 約3,650ha
(仙台市, 名取市, 岩沼市, 東松島市, 亶理町, 山元町)
- ・ 復興基盤総合整備事業: 2市2町 4地区 約350ha
(石巻市, 気仙沼市, 七ヶ浜町, 南三陸町)

なお, 現在調査中の地域もあり, 面積変更の可能性がある。

(参考4) 主な復旧状況

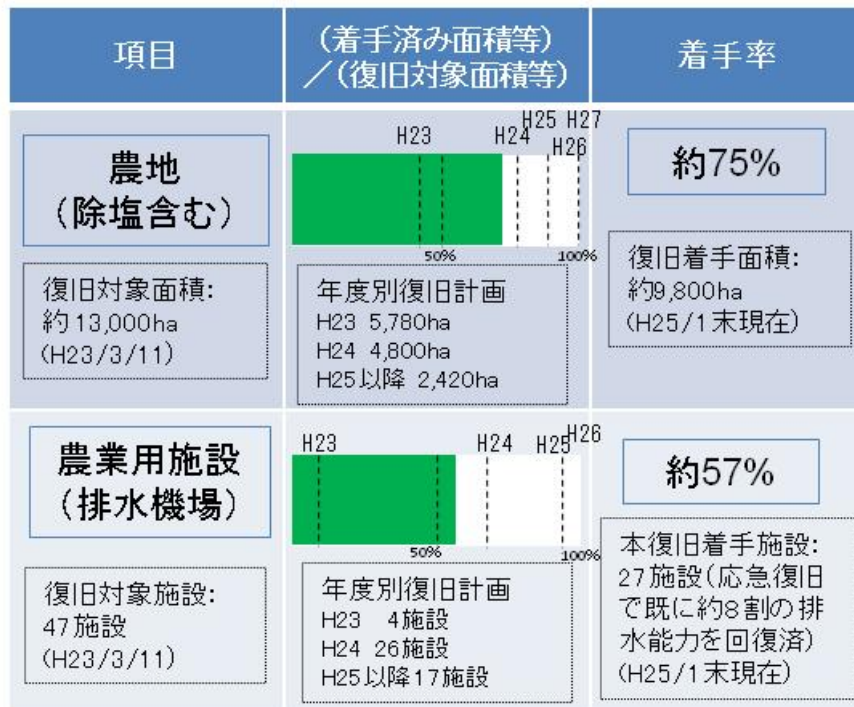

※ 上記の復旧状況は, 今回のロードマップの見直しに伴い, 表記方法を見直したものの

(参考5) 農地の復旧状況 (石巻市北上町女川の事例)

〈被災直後〉



〈除塩作業〉



〈農地復旧後〉



〈水稻作付再開状況〉



〈収穫状況〉

